

VERBALE di incontro tenuto il 16 ottobre 2013 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Nodo e Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura Milano.

Partecipano alla riunione

- per RFI: Episcopo, Fiorini, Antuofermo, Torrelli.
- per le Segreterie Regionali e per RSU: nominativi indicati in allegato.

Ordine del giorno: Programmi attività nel periodo ottobre - novembre - dicembre 2013.

L'incontro è aperto con l'esame di alcune problematiche evidenziate dalle R.S.U. e non previste dall'ordine del giorno.

Al riguardo, dopo ampia discussione, le Parti convengono che nel prossimo incontro sulle lavorazioni, la Società produrrà report relativi alle notti effettuate, alle abilitazioni possedute dal personale e al programma di formazione.

Si prosegue quindi con l'esame dell'ordine del giorno.

La Società illustra i programmi di attività del periodo ottobre – novembre – dicembre 2013 dell'Unità Territoriale Milano Nodo, specificando le lavorazioni, i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 aprile 2012 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non dovranno essere inseriti nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta a mese.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.

In relazione al lavoro notturno la Società, in coerenza a quanto disposto dal CCNL, procederà a monitorare tale fenomeno impegnandosi ad una migliore distribuzione del personale interessato.

Milano, 14 ottobre 2013

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

Per le R.S.U.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

[Handwritten signatures and names of representatives from FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, and FAST Ferrovie, along with RSU representatives.]

1

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2013**

Elenco attività

1. MILANO P.GARIBALDI – Manutenzione straordinaria armamento e modifiche 1° e 2° fasci ricovero
2. MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento
3. PARONA – Modifiche IS
4. VITTUONE - Realizzazione nuovo PRG
5. MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento
6. MILANO CENTRALE: ultimazione modifiche di Parco Centrale
7. MILANO CENTRALE: Modifiche per la realizzazione del progetto “Asse del Gottardo”
8. TORINO – PADOVA – Potenziamento tecnologico
9. PCM MILANO GRECO – Spostamento CTC
10. MILANO LAMBRATE – Rinnovo TE
11. MILANO SMISTAMENTO – Modifiche per scissione da FS Logistica e manutenzione all'armamento
12. MILANO SMISTAMENTO – Rinnovamento n° 4 deviatori
13. MILANO PORTA GENOVA –PRG - Modifiche ACEI e realizzazione telecomando
14. RHO-VITTUONE: Ammodernamento ponte A4
15. LINEA GENOVA: rinnovamento binario fra Lambrate e Rogoredo
16. LINEA MORTARA: Eliminazione passaggi a livello soppressi
17. NUOVA FERMATA FORLANINI – lavori propedeutici alla realizzazione della fermata
18. MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Rimozione attraversamenti elettrici “TERNA”
19. MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Costruzione nuovo cavalca ferrovia
20. RHO – Rimozione pali ex linea primaria
21. MILANO GRECO – T.B.SEVESO: Manutenzione deviatori

Luca Rocca
Pierluigi Rocca
Polipino Rocca
P.M.I.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

1		MILANO P.GARIBALDI – Manutenzione straordinaria armamento e modifiche 1° e 2° fasci ricovero <i>NON CONTEMPORANEA ALLA SCHEDA 24</i>
4 →	1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatori e binari nonché ultimazione PRG 2° fascio ricovero. Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita mediante ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00 a seconda degli enti interessati e interruzioni in periodo diurno. A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT. <i>2/3</i>
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: n° 6 V/S

2		MILANO CERTOSA – Manutenzione straordinaria armamento
5 →	1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatori Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita mediante ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00 a seconda degli enti interessati e interruzioni in periodo diurno. A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT. <i>2/3</i>
	2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12
	3	Interruzioni puntuali: no
	4	Fine settimana: n° 3 V/S

RFI
[Signature]

CSSE
[Signature]

RSU
[Signature]

WILT
[Signature]

RFI
[Signature]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

3		PARONA – Modifica IS
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE La fase 2 prevede la modifica del segnalamento lato Milano con arretramento di 100 dei segnali "3S" e "4S" verso il fabbricato viaggiatori e l'attivazione della nuova comunicazione 2a-2b fra precedenza e binario di corsa lato Mortara Sono previste lavorazioni prevalentemente in periodo diurno. L'attività principale sono di modifiche in cabina. È previsto un impegno medio di personale IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag sporadicamente) degli impianti di giurisdizione e sussidio da altri impianti dell'UT.	<i>NO TERZA NOTTE</i>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 5 dalle ore 23:40 alle 5:00	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: no	

4		VITTUONE - Realizzazione nuovo PRG
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE In previsione al progetto del SCC Torino – Padova, si rende necessario eseguire il PRG dell'intera stazione di Vittuone con modifica del piano del ferro e relativa elettrificazione e segnalamento. Attualmente le modifiche lato Magenta sono ultimate. A partire dal 18 ottobre saranno eseguite le modifiche all'armamento che prevedono: - modifica del tracciato del binario di precedenza dispari; - rinnovo con spostamento planimetrico di n° 4 comunicazioni; - posa di una nuova comunicazione lato Magenta; - eliminazione per semplificazione impianti di n° 2 comunicazioni. - Spostamento e attivazione nuovo segnale della precedenza dispari lato Rho Ogni singola attività prevede le relative modifiche TE ed IS. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30. È previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS 2/3 Ag) e TE 2 Ag) degli impianti di giurisdizione e in sussidio da altri impianti dell'UT.	<i>18 ottobre 20 dicembre 15 DIC</i>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: n° 10 V/S	

RFI
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

0022
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Polipino
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RSV
[Handwritten signature]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

4° TRIMESTRE 2013

4

5	MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento
	<i>ATTIVITA' IN SERIE CON ATTIVITA' ARMAMENTO SCHEDA 7</i>
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita mediante ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M - V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 - 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (3 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 10 V/S

ATTIVITA' IN CORSO %
 21/4 2/3 20 DAL

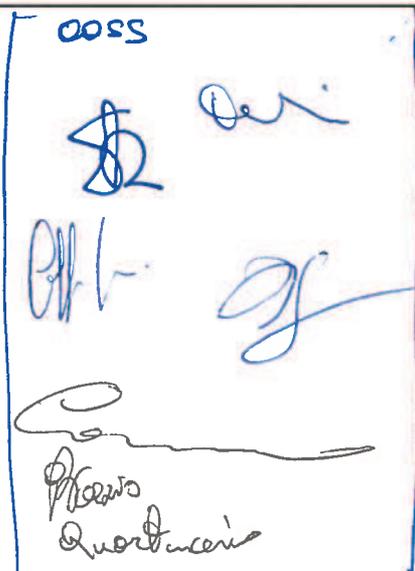
6	MILANO CENTRALE: ultimazione modifiche di Parco Centrale
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE La realizzazione dell'ingresso indipendente della linea Venezia a Milano Centrale ha reso necessario apportare modifiche anche al limitrofo Parco Centrale. Nel trimestre sono previste le attività di sistemazione della radice e relativi binari dal I al VII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IS <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione modifiche IS di piazzale e di cabina relative all'attivazione dell'impianto, attività prettamente diurna. - TE <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione, stendimento e modifica delle condutture di contatto per adeguamento al nuovo tracciato. - Prolungamento elettrificazione dei binari del parco Centrale <p>È previsto un impegno medio di personale IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 2 V/S


01,00 0,400

TERZA NOTTE

NO

RFI


COSS

 Mario Quattrocchi

RSU
 Luca Rocca


~~_____~~

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

7	MILANO CENTRALE: Modifiche per la realizzazione del progetto "Asse del Gottardo"
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Realizzazione delle modifiche IS (cabina e piazzale), TE ed Armamento relative all'attivazione del Potenziamento "Gottardo", necessario al cadenzamento orario del servizio internazionale Milano - Zurigo ai minuti 25 (partenza) e 35 (arrivo) a partire dal cambio orario di giugno 2014. Al fine di consentire l'eliminazione delle interferenze di circolazione e generare il conseguente aumento delle potenzialità di impianto, sono stati progettati interventi concernenti modifiche tecnologiche e di armamento a Milano Centrale che consentono la specializzazione in stazioni elementari ed un aumento del numero di movimenti contemporanei.</p> <p>In questo periodo è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IS: L'esecuzione delle modifiche IS di cabina, con sostituzione di unità ACEIT, esecuzione di filature, installazioni di nuovi armadi relè e delle nuove unità. Sul piazzale sono previsti i lavori relativi all'arretramento dei segnali di partenza S112 ed S113 (prima fase), S109, S110, S111 (seconda fase). Le modifiche comportano la realizzazione di circa 150 nuovi itinerari. Vengono inoltre effettuate modifiche al Quadro Luminoso e le modifiche SCMT. Impegno medio di n° 2 Ag IS - TE: Modifiche agli impianti TE conseguenti alla realizzazione della nuova bretella tra i binari 11 e 12 e di una nuova comunicazione sulla linea Malpensa. Impegno medio di n° 2 Ag TE per scorta mezzi d'opera e controllo lavori per 15 notti - ARMAMENTO: Posa mediante costruzione fuori opera e successivo varo della nuova bretella fra il binario 12 e 13 costituita da n° 2 deviatori semplici e n° 2 scambi intersezione e nuova comunicazione sulla linea Malpensa. Impegno di 3/4 Ag LV - 2 Ag IS - 2 Ag TE per 10 notti <p style="text-align: right; color: blue;"><i>ATTIVITA' NON CONTEMPORANEA ALLA SCALDA S</i></p> <p><u>Per tale attività è previsto eventuale sussidio di personale da altri impianti dell'UT</u></p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20 tra le 23,40 -5,00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 5 V/S

RPI
[Handwritten signature]

OASS
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
P. Quattucci

RSU
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6


UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

POGRAMMA ATTIVITA'

4° TRIMESTRE 2013

8	TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.</p> <p>In questo periodo è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi. - Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti - Impianti STSI - Impianto GbE Posa in opera canalizzazioni, posa cavi IS/LFM, posa apparecchiature di piazzale ed allacciamenti negli impianti di Rho, Certosa, Ghisolfa, Garibaldi, Lambrate, bivio Musocco e T.B.Seveso anche contemporaneamente con un limite massimo di 3 cantieri a notte. - Modifiche TE a B.vo Musocco per garantire la visibilità segnali (10 notti – 2 Ag TE) <p>Impegno medio di personale Zone IS/TE/LV di giurisdizione (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori.</p> <p>Per tale attività è previsto eventuale sussidio di personale da altri impianti dell'UT</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 32 dalle 23,30 alle 4,30 a seconda delle linee interessate
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 8 V/S

10 9	PCM MILANO GRECO – Spostamento CTC
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO Lavorazioni previste nel trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spostamento CTC di: <ul style="list-style-type: none"> Colico Bacini Cremonesi Parma-S.Zeno Laveno Mortara <p>Le attivazioni sono previste a partire dal 16 di novembre Le risorse maggiormente impegnate sono le zone TLC e il reparto Attivatori e marginalmente in assistenza il personale della zona IS di Lambrate. L'attività si svolgerà sia in periodo diurno che notturno per una durata di 6 settimane interessando 3 D/L</p> <p>È previsto un impegno medio di personale ^{IS}TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 10
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 5 V/S e 2 d/l

RFI   OASS  RSU

7

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2013

10	MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e getto basamenti palo - Alzamento pali e portali e travi MEC - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali. <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S nella radice lato Nord delle linee Cintura e Merci nel mese di ottobre. Nel mese di novembre sono previsti lavori sulla linea Genova in tutta la stazione, mentre a dicembre i lavori interesseranno la linea Bologna.</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e in sussidio da altri impianti dell'UT</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 23:30 e le ore 5:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 10 v/s

11	MILANO SMISTAMENTO – Modifiche per scissione da FS Logistica e manutenzione all'armamento <i>in alternativa alla scheda 12</i>
1	<p>Descrizione attività: SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI Tale attività prevede nel trimestre in corso la costruzione dei nuovi binari di presa e consegna carri del raccordo SAIMA e i relativi deviatori nonché attività di revisione deviatori.</p> <p>L'attività sarà eseguita in periodo diurno e vede l'impegno medio prevalentemente del personale LV (3/4 Ag), IS (2 Ag saltuariamente) e TE (2 Ag saltuariamente)</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: no
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no

RFI
[Signature]

COSS
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RSU
Luca P...

[Signature]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

12	MILANO SMISTAMENTO - Rinnovo di n.4 deviatori <i>In alternativa alle schede 11</i>
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>È previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo n° 4 deviatori semplici (123b - 127 b - 217a - 217b) <p>Il rinnovo del deviatoio prevede le seguenti fasi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzione fuori opera di tutto l'armamento (impegno sporadico di controllo Agenti LV) - montaggio delle casse di manovra (impegno medio di 3 Ag IS) - realizzazione circuiti di ritorno TE (impegno medio di 2Ag TE in periodo diurno) - varo dei deviatori: è previsto un impegno medio di 4 Ag. LV, 2 Ag. TE e 2/3 Ag. IS per un totale di n° 4 interruzioni - completamenti e finiture: è previsto un impegno medio di 2 Ag. LV, 2 Ag. IS per un totale di n° 6 interruzioni - sistemazione poligonazione ldc sulla comunicazione 217a/b impegno di 4 Agenti TE <p>Le 10 interruzioni saranno in periodo diurno e comprendono 1 sabato e 2 Domeniche</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L-V: n° 7 di 5 h tra le ore 9 e le ore 15
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 1 sabato dalle 9:00 alle 14:00 e 2 Domeniche dalle 6:00 alle 12:00 <i>8,00/16,36 6,00/13,36</i>

SAPO PROPRIA

SARA' GARANTITA' IL DIRITTO AL PARTO

13	MILANO PORTA GENOVA - Modifiche ACEI e realizzazione telecomando
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</p> <p>Il progetto prevede di eseguire modifiche presso l'ACEI di Milano Porta Genova con modifica parziale del piano del ferro e relativa elettrificazione dovute principalmente a demolizioni.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo n.6 deviatori con le conseguenti assistenze/modifiche IS, TE n° 12 notti (mediamente 4 Ag LV, 2 Ag IS, 2 Ag TE); <i>(IN ALTERNATIVA ALLE SCHEDA 11 NON CONTEMPORANEA AGLI 15)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione impianti TE dismessi (2 Ag. TE per disalimentazione, scorta e controllo) - Rimozione binari e deviatori dismessi (2 Ag. di scorta e controllo e 2 Ag TE per disalimentazione) - Modifiche IS (ACEI) a San Cristoforo attività diurna <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 12 dalle ore 23,40 alle ore 5,00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 3 V/S

15

16

RPI

Amorini

COSS

Dei

Amorini

Amorini

RSU

Luce Procopio

9

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

14	RHO - VITTUONE – Ammodernamento ponte A4
1	<p>Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI</p> <p>In vista di EXPO 2015, ANAS ha previsto l'ammodernamento e il potenziamento dell'autostrada A4. Ciò comporta il relativo ampliamento delle opere di scavalco sulla ferrovia. L'oggetto di tale attività è il ponte situato fra Vittuone e Rho. È prevista la costruzione di un ponte provvisorio che consente la demolizione del ponte esistente e la successiva ricostruzione.</p> <p>Nel trimestre in oggetto si svolgeranno le seguenti lavorazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottofondazioni, fondazioni, elevazioni in periodo diurno all'interno di area di cantiere - estrazione palancole e varo travi e getto dell'impalcato in interruzioni notturne con disalimentazione della l.d.c. <p>L'attività è svolta con interruzioni notturne (L/V a V/S) con impegno di 2 Ag LV e/o 2 Ag TE. L'attività sarà svolta con le stesse interruzioni previste per la realizzazione del PRG di Vittuone e verrà impegnato lo stesso personale previsto per tale attività.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24 dalle ore 0,00 – 5,30
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana e festivi: n° 6 v/s

15	<p>LINEA GENOVA: rinnovamento binario fra Lambrate e Rogoredo NON IN CONTEMPORANEA SCHEDA 13 e 16</p>
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>L'attività prevede la sostituzione delle traverse, delle rotaie e il risanamento della massiciata. L'attività è in corso e si concluderà indicativamente entro il 15/11/2013 (5 notti infrasettimanali L/M - V/S) L'attività viene eseguita mediante ditta appaltatrice. Il Personale di RFI è impegnato in: Personale LV attività di controllo e scorta (mediamente 10/12 Ag) Personale TE disalimentazione l.d.c. e ripristino circuito di ritorno (mediamente 3 Ag) Personale IS smontaggio e ripristino enti IS e SCMT (mediamente 2 Ag) con ausilio del personale della Ditta per attività di spostamento pietrisco e realizzazione passaggi cavi</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 20 dalle ore 23:30 alle 05:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 5 V/S

RFI
Fisch

[Handwritten signature]

COSS
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Pierro
Quattucci

RSV
Luca Pizzoglio

[Handwritten signature]

10

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

16	LINEA MORTARA: Eliminazione passaggi a livello soppressi <i>in alternativa NON CONTEMPORANEA A</i>	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività prevede la sostituzione delle traverse, delle rotaie e il risanamento della massicciata mediante varo di campata di binario. L'attività viene eseguita mediante ditta appaltatrice. Il Personale di RFI è impegnato in: Personale LV attività di controllo e scorta (mediamente 3/4 Ag) Personale TE disalimentazione l.d.c. e ripristino circuito di ritorno (mediamente 2 Ag) Personale IS smontaggio e ripristino enti IS e SCMT (mediamente 2 Ag) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT	
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16 dalle ore 23:30 alle 05:30	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: n° 4 v/s	

17	NUOVA FERMATA FORLANINI – lavori propedeutici alla realizzazione della fermata	
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE L'attività prevede la costruzione di una nuova fermata ferroviaria tra le stazioni di Milano P. Vittoria e B. Lambro (Linea Passante) e tra le stazione di Milano Lambrate e P.M. Trecca (Linea Cintura). Nel trimestre in esame, le attività eseguite saranno prevalentemente di bonifica bellica, cantierizzazione e costruzione opere provvisionali per sfondamento muro di sostegno Passante e platea di varo del monolite per costruzione sottopasso. (spostamento pali TE) Le attività di bonifica bellica e cantierizzazione sarà eseguita di giorno mentre le opere provvisionali saranno svolte in interruzioni notturne di circa 4 h fra le 23:30 e 5:30 Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dei settore LV e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT	
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 25 dalle ore 23:30 alle 05:00	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: n° 5 v/s e n° 4 d/1 <i>+ 3 domeniche diurne</i> 800 16,36	

RFI
Severini




OSS





Quarantucci



RSU

Luca Procopio





UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

POGRAMMA ATTIVITA'



4° TRIMESTRE 2013

11

18	MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Rimozione attraversamenti elettrici "TERNA"
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI In vista di EXPO 2015 per la realizzazione della piastra espositiva e la costruzione del nuovo cavalcavia ferroviario previsto nella modifica del sistema viario di accessibilità all'esposizione universale di Milano 2015, consistente in particolare nel collegamento della SS11 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi, si rende necessaria la rimozione di n° 3 attraversamenti aerei di "TERNA" Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale del settore TE (2/3 Ag) dell'impianto di giurisdizione per 8 notti infrasettimanali per disalimentare la linea di contatto
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 6 dalle ore 01:00 alle 03:40
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: V/S: n° 2 dalle ore 01:00 alle 03:40

19	MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Costruzione nuovo cavalcavia ferroviario
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI In vista di EXPO 2015 è prevista la modifica del sistema viario di accessibilità all'esposizione universale di Milano 2015, consistente in particolare nel collegamento della SS11 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi. Questo collegamento prevede la costruzione di un cavalcavia ferroviario in stazione di Certosa. Nel trimestre in corso sono previste le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Cantierizzazione (attività diurna) - Infissione palancole per costruzione pila centrale fra La linea Varese e lo scalo di Fiorenza (attività notturna infrasettimanale) impegno di 7 notti per 2 Ag TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dell'impianto di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M- G/V: n° 7 dalle ore 01:00 alle 03:40
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: V/S n° 1 dalle ore 01:00 alle 03:40

20	RHO – Rimozione pali ex linea primaria
1	Descrizione attività: DISMISSIONE IMPIANTI L'attività prevede la rimozione di n° 5 pali della linea primaria dismessa eseguita con ditta appaltatrice. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di <u>2 Ag TE</u> per 5 notti l/m – v/s. Personale dell'impianto di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-G/V: dalle ore 23:00 alle 05:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 1 v/s dalle ore 23:00 alle 05:00

RFI    

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO POGRAMMA ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013

21	MILANO GRECO - T.B.SEVESO: Manutenzione deviatori
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatori Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita mediante ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M - V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 - 5,00. a seconda degli enti interessati. A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 4 V/S

in attesa di no alla loro consegna

RFI
[Handwritten signature]

0055
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RSU
[Handwritten signature: Luca Procopio]

[Handwritten signature]
