

VERBALE DI ACCORDO fra RFI SpA – DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE – DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE BOLOGNA unitamente alla S.O. DRUO-Risorse Umane BO-FI e le Segreterie Regionali Emilia-Romagna delle Organizzazioni Sindacali Fit/Cisl, Ultrasporti, Ugl Ferrovieri, SLM Fast/Confsal e ORSA Ferrovie e la RSU 7 Bologna

Addi 14 aprile 2026

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo Nazionale del 10/01/2024 e dall'Accordo Territoriale del 26/11/2025, dopo un'ampia e approfondita analisi delle esigenze produttive della DOIT di Bologna riferite al periodo 01 maggio 2026 - 30 giugno 2026, concordano le modalità espone negli allegati al presente verbale.

Per finalizzare l'insieme di tutte le attività manutentive pianificate e alla luce dell'allocazione delle interruzioni riferibili alle lavorazioni indicate, è stato effettuato uno studio volto all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale concentrandolo quanto più possibile in turni sovrapponibili ai citati spazi manutentivi, attraverso una eventuale rimodulazione delle fasce e potenziando, in tal modo, le consistenze delle squadre per riguardare la produttività nel rispetto delle tempistiche attese e il riequilibrio dei carichi di lavoro.

Pertanto, confermando come lo sviluppo e la cadenza del turno di lavoro applicato nella DOIT di Bologna, sia quello definito dall'accordo territoriale del 26/11/2025, in coerenza con quanto previsto al punto H dell'Accordo Nazionale del 10/01/2024 per le specifiche lavorazioni indicate nei prospetti allegati, le parti concordano di applicare l'indicazione contenuta negli stessi.

In particolare, in seguito alla presentazione dei PdA relativi al bimestre 01 maggio 2026-30 giugno 2026 le parti concordano sulle modifiche presenti in relazione a:

1. Alle attività di cui ai punti n° 1, 7, 8 e 14 dell'UT Bologna Nodo;
2. Alle attività di cui al punto n° 15 dell'UT Emilia;
3. Alle attività di cui ai punti n° 1, 9 e 10 dell'UT Romagna.

Resta ferma, ai fini della corresponsione delle indennità previste dal punto G comma 9.b dell'Accordo Nazionale, la conferma e la piena validità del turno pianificato riportato nell'accordo territoriale del 26/11/2025.

Si condivide la conclusione del processo relativo alla Manifestazione di Interesse (MdI) per la copertura delle posizioni da CT di cui all'accordo del 26 novembre 2025 che riscontra un numero di 46 risorse idonee, delle quali 34 già in possesso delle previste abilitazioni alle quali verrà formulata la proposta di immissione entro il mese di maggio; le rimanenti 12 risorse idonee saranno avviate ai prescritti percorsi abilitativi.

Al fine di proseguire nella copertura delle posizioni da CT e TEC previste dal nuovo modello manutentivo concordato, la Società emanerà apposite MdI entro il mese di maggio.

Inoltre, la Società conferma l'impegno a proseguire nel Piano di acquisizioni di risorse da mercato finalizzato ad un adeguamento rispetto ai volumi di produzione richiesti dal nuovo modello manutentivo.

Le OOSS preso atto dell'impegno, sottolineano la necessità di analizzare attentamente le difficoltà di reclutamento di risorse con diplomi tecnici nel territorio afferente alla DOIT di Bologna, dalla stessa Società riconosciuta, chiedendo altresì di trovare soluzioni alternative alle modalità comunicative dell'offerta di lavoro.

Si ribadisce l'obiettivo comune delle parti di condividere misure che possano agevolare la conciliazione di vita e lavoro, anche confermando l'impegno preso dalla Società nell'accordo del 26 novembre 2025 di non pianificare attività di manutenzione ordinaria nei giorni festivi di cui all'art. 29 punto 2.1 del CCNL e nello specifico del bimestre in oggetto del presente accordo non sono previste attività di manutenzione straordinaria.

(Area containing multiple handwritten signatures in blue and black ink)

Dopo ampia ed articolata discussione le parti concordano che tutte le competenze saranno regolate nel rispetto del CCNL. Il presente accordo costituisce, unitamente all'Accordo Nazionale del 10 gennaio 2024 e all'Accordo Territoriale del 26 novembre 2025, al vigente CCNL Mobilità/area AF e al Contratto aziendale del Gruppo FS, il riferimento della DOIT di Bologna, fermo restando che gli accordi precedentemente sottoscritti restano confermati per le parti dagli stessi non modificati.

Per RFI S.p.A



per le

OO.SS / RSU

FIT/CISL


UILTRASPORTI

UGL Ferrovieri

S.L.M. FAST Confsal

ORSA Ferrovie

RSU





RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DOIT Bologna

PdA UT Nodo
maggio-giugno 2026

155


INTRODUZIONE

Seguendo le Linee Guida per la pianificazione delle risorse finalizzate al processo della manutenzione la Direzione Operativa Infrastrutture di Bologna persegue gli obiettivi:

- massima sicurezza e affidabilità della circolazione su tutte le tipologie di linea;
- saturazione orari di lavoro con attività strategiche (*obblighi di legge, manutenzione ciclica prioritaria e non, piano stagionale, manutenzione da analisi di diagnostica fissa e mobile e da analisi delle anomalità, investimenti e potenziamenti*);
- massimizzare l'utilizzo dei mezzi di lavoro;
- efficientare e razionalizzare la gestione del pronto intervento;
- ottimizzare e potenziare le internalizzazioni con particolare attenzione alle tecnologie;
- ottimizzare la gestione dei materiali;
- dare corso agli interventi previsti nei Contratti AQ (Armamento, OC, TE e IS);
- garantire gli impegni verso le altre società del Gruppo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTERVENTI MANUTENTIVI

TIPOLOGIE MANUTENTIVE

ORDINARIA

- Mantenere integrità originaria del bene
- Mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni
- Contenere il normale degrado d'uso
- Garantire la vita utile del bene
- Far fronte ad eventi accidentali

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STRAORDINARIA

- Incrementare il livello di sicurezza
- Incrementare il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela
- Elevare l'affidabilità ed efficienza delle infrastrutture ferroviarie
- Elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture ferroviarie
- Uniformare gli standard prestazionali degli attuali impianti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ECCEZIONALE

- Ripristinare l'efficienza dei beni a seguito calamità naturali, furti, atti vandalici, ect...

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTERVENTI MANUTENTIVI

POLITICHE MANUTENTIVE

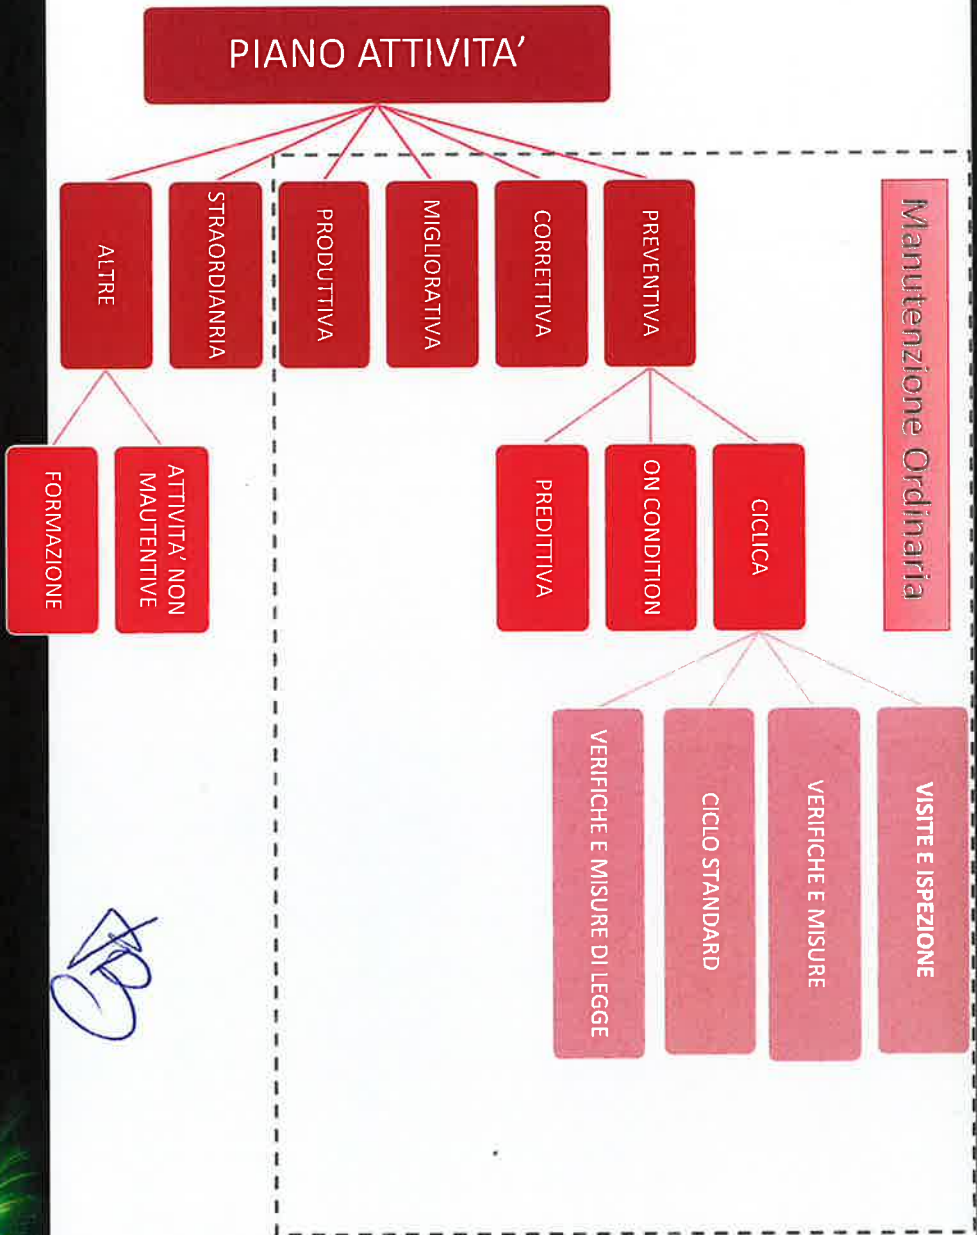

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Piano di Attività UT Nodo 2026

n.° Notte	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Ore Correttiva	Ore Preventiva Giefica	Ore On-Condition	Ore altre Attività	Ore Formazione	Ore attività Non Manutentiv	Ore Attività Internalizzata	Ore Manutenzione Straordinaria	
644.170,50	9.588,58	193.433,93	103.698,20	15.305,28	75.093,15	16.115,53	92.347,18	97.872,80	603.454,64
532	6103	5097	910	191	0	1870	3495	18197	

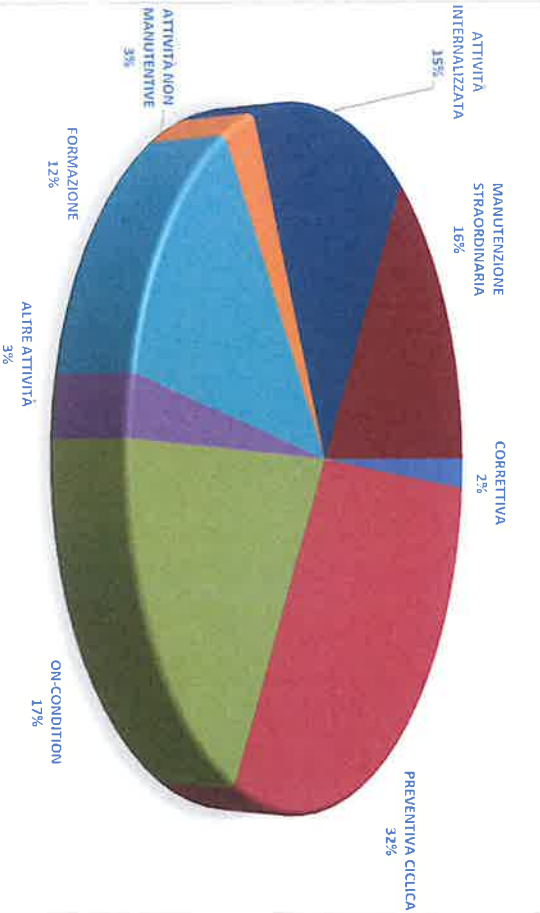

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

n.° Notte	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBI SOGNO
	Ore Correttiva	Ore Preventiva Gelfica	Ore On-Condition	Ore altre Attività	Ore Formazione	Ore attività Non Manutentiv	Ore Attività Internalizzata	Ore Manutenzione Straordinaria	
107.362	1.667	33.329	18.242	4.865	13.493	1.973	20.497	12.829	106.895
89	1017	850	151	32	0	405	571	3114	

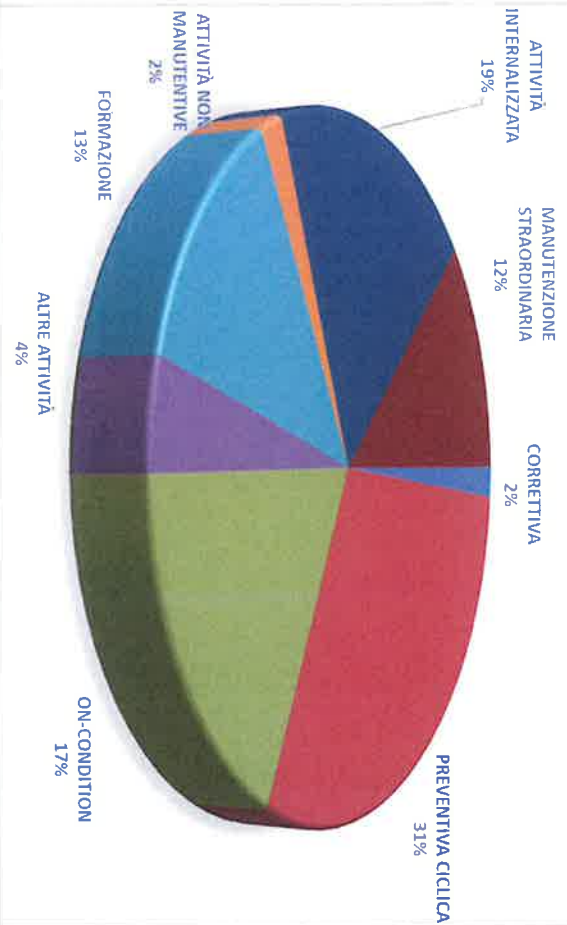

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

n°	Località/Tratta	Descrizione attività	Linea	Appaltatore
1	S. Benedetto V.S. - Prato	PC80	BO-PO	Notari - Ceprini - GCF - CLF - <small>Calo</small>
2	Verrio e Vaiano	Restyling sottopassi Verrio e Vaiano	BO-PO	Baraldini
3	Casalechio G.	Casalechio G. attrezzaggio PAIPL km 122+176	BO-PT	Mernec
4	Riola	Riola attrezzaggio PAIPL km 85+217	BO-PT	Mernec
5	PM S.Viola-PM Tavernelle	BO/VR Risanamento massicciata con contestuale abbassamento Bin P da Km 9+800 a Km 11+560	BO-VR	CLF
6	Bologna-Castelnaggiore	BO/PD Risanamento massicciata Bin P da Km 7+100 a Km 9+300	BO-PD	CLF
7	Cintura	LAVINO/B.CALDERARA Rinnovo/Risano Bin PARI/DISP Km 10+327 a Km 14+779	Cintura	CLF
8	S.Piero a Sieve -PM Idice	S.Piero a Sieve -PM Idice Livellamento sistematico	BO-FI AV	CLF
9	Nodo	Regolazione terranca solare serragle Bologna C.le/BO-RN/BO-VR/BO-PO/Cintura	Nodo	CLF
10	Cintura	BO S.Donato-BO Fiere Rinnovo TE Bin. P+D	Cintura	GCF
11	B.Castelfranco Est-B.Emilia	Sostituzione della LDC B.Castelfranco Est-B.Emilia	BO-MI AV	GCF
12	PM Lavino-C.Franco	Sostituzione della LDC PM Lavino-C.Franco	BO-PC	GCF
13	Nodo	Sostituzione della LDC Bologna C.le	Nodo	GCF
14	Firenze Cast.-B.Emilia	Sostituzione della LDC	BO-FI AV	GCF








Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/1

1	BO-PO: PC80
1	Descrizione attività: Opere civili necessarie a ottenere l'adeguamento gallerie a sagoma PC/80 della linea Prato – Bologna nella tratta Bologna Cle- San Benedetto Val di Sambro Periodo di lavorazione: Gennaio - Dicembre 2026 Impegno di personale - UMTIV: 12/14 - UMIS2: 12/14 - UMTTR2: 6/7 2 Interruzioni notturne: p.m. 3 Interruzioni puntuali Diurne: - Interruzioni diurne dal Lunedì al Venerdì dal 04/05 al 30/06 dalle 9.45 alle 13.50. 4 Interruzioni weekend/festivi: p.m. 5 Variazioni di Orario No standard: p.m. 6 Variazioni di fascia: necessità di incrementare il turno del mattino annunciando a prestazioni notturne o pomeridiane per LV ed IS. 7 Notte >8 h: p.m.




2	BO-PO: Resyding sottopassi Vernio e Vaiano
1	Descrizione attività: Resyding sottopassi Periodo di lavorazione: Termine a giugno 2026 Impegno di personale - UMTIV: 2 - UMTTR: 2 2 Interruzioni notturne: p.m. 3 Interruzioni puntuali Diurne: - Interruzioni diurne dal Lunedì al Venerdì dal 04/05 al 30/06 dalle 9.45 alle 13.50. 4 Interruzioni weekend/festivi: p.m. 5 Variazioni di Orario No standard: p.m. 6 Variazioni di fascia: p.m. 7 Notte >8 h: p.m.








Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/2

3 BO-PT: Casalechio G. attrezzaggio PAIPL km 122+176	
1	Descrizione attività: attrezzaggio PAIPL km 122+176 Periodo di lavorazione: 19 maggio - 23 maggio 2026 Impegno di personale - UMIS: 4
2	Interruzioni notturne: Casalechio G.-Porretta D/La G/V dalle 23:40 alle 04:40
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

4 BO-PT: Riola attrezzaggio PAIPL km 85+217	
1	Descrizione attività: attrezzaggio PAIPL km 85+217 Periodo di lavorazione: 26 maggio-28 maggio 2026 Impegno di personale - UMIS: 4
2	Interruzioni notturne: Casalechio G.-Porretta D/La G/V dalle 23:40 alle 04:40
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/3

5	BO-VR: BO/VR Risanamento massiccata con contestuale abbassamento Bin P da Km 9+800 a Km 11+560
1	Descrizione attività: Risanamento con contestuale abbassamento della massiccata del binario PARI dal km 9+800 al 11+560
	Periodo di lavorazione: 20 aprile-16 maggio
	Impegno di personale - UMLIV: 6 - UMTS: 4 - UMTTE: 3
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V S.Viola-PM Tavernelle binario PARI dalle 00:00 alle 05:00 con contemporanea DISP dalle 0:15 alle 4:45
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

buille

6	BO-PD: BO/PD Risanamento massiccata Bin P da Km 7+100 a Km 9+300
1	Descrizione attività: Risanamento della massiccata del binario PARI dal km 7+100 al 9+300
	Periodo di lavorazione: 11 maggio - 30 maggio 2026
	Impegno di personale - UMLIV: 6 - UMTS: 4 - UMTTE: 3
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V Bologna Cle-Casteln'aggreto interruzione di linea dalle 00:00 alle 04:20 con contemporanea binario DISP Casteln'aggreto-B. Trabollo dalle 00:00 alle 04:20
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

[Signature]

[Signature]

[Signatures]



[Signatures]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/4

7	Cintura LAVINO/B-CALLDERARA Rinnovo/ Risano Bin PARI/DISP Km 10+327 a Km 14+779
Descrizione attività: Rinnovo /Risano binario PARI+DISP dal km 10+327 al km 14+779 Periodo di lavorazione: 11 maggio - 24 luglio Impegno di personale - UMLV: 5/8 - UMLIS: 4 - UMLTE: 3 2 Interruzioni notturne: p.m. 3 Interruzioni puntuali Diurne: - Interruzioni diurne dal lunedì al venerdì dal 11 maggio al 22 maggio dalle 9:30 alle 13:00. - Interruzioni diurne dal lunedì al venerdì dal 25 maggio al 3 luglio dalle 9:00 alle 14:00 - Interruzioni diurne dal lunedì al venerdì dal 6 luglio al 24 luglio dalle 9:30 alle 13:00. 4 Interruzioni weekend/festivi: p.m. 5 Variazioni di Orario No standard: p.m. 6 Variazioni di fascia: necessità di incrementare il turno del mattino rinunciando a prestazioni notturne o pomeridiane (UVI e ISI) ed eventuale sussidio di altre ULM di settore. 7 Notte >8 h: p.m.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8	BO-FI AV. S. Piero a Sieve -PM Idice Livellamento sistemtico
1 Descrizione attività: Livellamento sistemtico Periodo di lavorazione: 25 maggio - 26 giugno 2026 Impegno di personale - UMLV: 4 - UMLIS: 3 - UMLTE: 3 2 Interruzioni notturne di linea: da D/1, a G/V B.Limilia- PM S.Pellegrino + PM S.Pellegrino-Fi Castello dalle 23:10 alle 05:50 3 Interruzioni puntuali Diurne: p.m. 4 Interruzioni weekend/festivi: p.m. 5 Variazioni di Orario No standard: p.m. 6 Variazioni di fascia: p.m. 7 Notte >8 h: SI	

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/5

9	
1	Descrizione attività: Regolazione diurna tramite irraggiamento solare delle serraglie
	Periodo di lavorazione: dal 1 giugno - 22 luglio 2026
	Impegno di personale - UML V: 3/4
2	Interruzioni notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali diurne: da Lunedì a Venerdì Interruzioni diurne della durata minima di 3 ore
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

10	
1	Descrizione attività: Attività di rinnovo TT3 del binario Pari+Disp della tratta Bologna S. Donato-Bologna Fiere
	Periodo di lavorazione: Inizio attività attualmente previsto per giugno 2026
	Impegno di personale - UML I: 5
2	Interruzioni diurne di linea: dal Lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
3	Interruzioni notturne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/6

11 BO-MI AV: Sostituzione della LDC B Caselfranco Est-B, Emilia	
1	Descrizione attività: Sostituzione della Linea di Contatto Periodo di lavorazione: dal 23 maggio al 5 giugno 2026 Impegno di personale - UMTT: 5
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V Interruzioni di linea notturne tratta PM Reno-B, C.Franco + PM rano-B, Emilia dalle ore 23,30 alle 05,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12 BO-PC: Sostituzione della LDC PM Lavino-C.Franco	
1	Descrizione attività: Sostituzione della Linea di Contatto Periodo di lavorazione: dal 23 maggio al 5 giugno 2026 Impegno di personale - UMTT: 5
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V Interruzioni notturne Padri/Dispari Bologna Cle-C.Franco della durata di 4 ore di principale + 3 di contemporanea
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Notte > 8 h: p.m.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Piano di Attività UT Nodo Mag-Giu 2026

Sintesi attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/7

13 Nodo: Sostituzione della LDC Bologna C.le

1	Descrizione attività: Sostituzione della Linea di Contatto Periodo di lavorazione: dal 23 maggio al 5 giugno 2026 Impegno di personale - UMTTE: 6
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V Interruzioni notturne ambito Bologna C.le della durata di 4 ore
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Noti > 8 h: p.m.

[Handwritten signature]

14 BO-FI AV: Sostituzione della LDC

1	Descrizione attività: Sostituzione della Linea di Contatto Periodo di lavorazione: dal 27 aprile al 22 maggio 2026 Impegno di personale - UMTTE: 5
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V B.Limita- PM S.Pellegrino + PM S.Pellegrino-Fr Castello dalle 23:10 alle 05:50
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni di fascia: p.m.
7	Noti > 8 h: SI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DOIT Bologna

PdA UTEM


maggio-giugno 2026

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività DOIT: GEN-DIC 2026

n.° Notti	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Ore Correttiva	Ore Preventiva Ciclica	Ore On-Condition	Ore altre Attività	Ore Formazione	Ore attività Non Manutentive	Ore Attività Internalizzata	Ore Manutenzione Straordinaria	
509.631,00	14.142,47	137.077,23	65.945,47	12.512,73	54.561,23	30.390,10	130.905,69	120.528,40	566.063,32
683	6024	2757	351	378	67	2576	5.480,00	18316	

TITOLO DEL GRAFICO

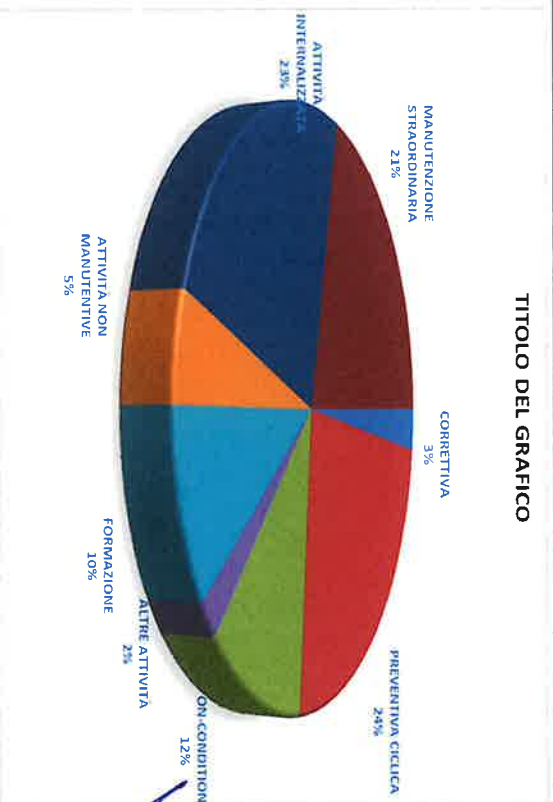

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: MAG-GIU 2026

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAG-GIU 2026

n.° Notte	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Ore Correttiva	Ore Preventiva Ciclica	Ore On-Condition	Ore altre Attività	Ore Formazione	Ore attività Non Manutentive	Ore Attività Internalizzata	Ore Manutenzione Straordinaria	
84.938,50	2.708,55	27.874,46	11.764,94	1.536,25	9.535,79	5.567,39	20.616,34	23.590,40	103.194,12
	127	1200	471	68	0	0	407	1172	3446

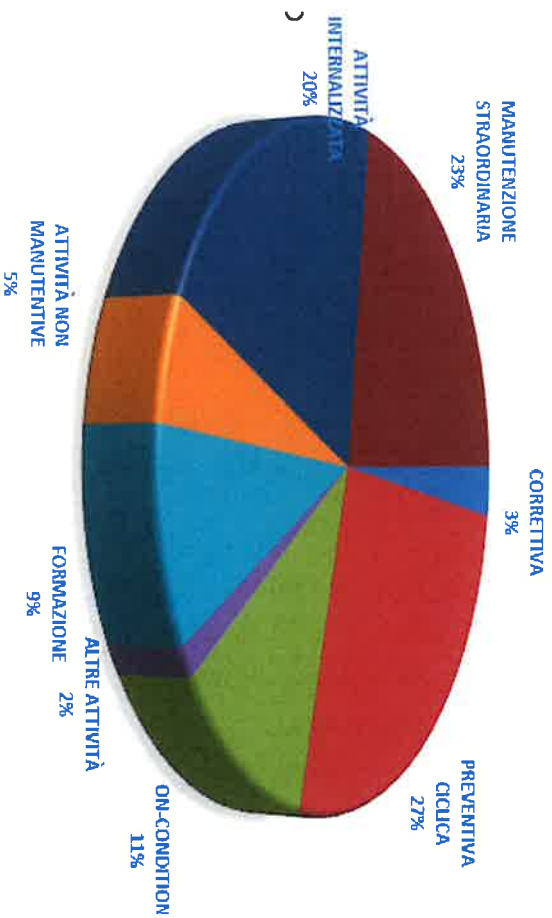

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEMI: sintesi attività MAG-GIU 2026

n°	Località/Tratta	Descrizione attività	Linea	Appaltatore
1	BV PIACENZA OVEST - PM LIVRAGA	Sostituzione rotarie linea AV	BO-MI AV/AC	CLF
2	PM CAMPEGINE	Montaggio sospensioni TE "OMNIA" 25 kV	BO-MI AV/AC	GCF
3	TRATTE VARIE	Manutenzione LdC con ditra	BO-MI AV/AC	GCF
4	TRATTE VARIE	Diserbo chimico	BO-MI AV/AC	SFI
5	ROLO NOV1 - SUZZARA	Rinnovo binari ambito tratta e località	MO-VR	CLF
6	RUBIERA	Innalzamento H.55 marciapiede II e alla pensilina ambito Rubiera	BO-PC	Cepini Costruzioni
7	FIORENZUOLA	Rinnovamento binario I est Fiorenzuola	BO-PC	CLF
8	FIDENZA	Rinnovamento binario VI, binari Carbonaia e Rimessa Fidenza	BO-PC	CLF
9	PARMA	Realizzazione barriere antirumore Parma	BO-PC	MICOS
10	PARMA	Adeguamento a standard 270 mmq binari merci Parma	BO-PC	GCF
11	FIDENZA	Rinnovamento dev. 13B Fidenza	BO-PC	CLF
12	TRATTE VARIE	Regolazione LRS serraglie con ditra	BO-PC	CLF
13	TRATTE VARIE	Eliminazione difetti e saldature difettose; Sostituzione GI	BO-PC	CLF
14	TRATTE VARIE	Diserbo chimico	BO-PC	SFI
15	PARMA	Rinnovamento deviatori 19A, intersezione scalo est, 18A/18B, 16B, 16A e 18B/17	BO-PC	CLF
16	TRATTE VARIE	Livellamento sistemtico con ditra	BO-PC	CLF

Boelli

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/1

[Handwritten signatures]

1 BO-MI AV/AC: Sostituzione rotarie linea AV/AC BV Piacenza Ovest - PM Livraga
1 Descrizione attività: Sostituzione rotarie binari pari e dispari tratta BV Piacenza Est - PC Piacenza della linea Bologna - Milano AV/AC
Periodo di lavorazione: 16 febbraio - 31 luglio 2026
Impegno di personale: - UMLY: 4/5 AM - UNTS: 2 ANI - UMTE: 3/4 AM
2 Interruzioni notturne: da D/L a G/V dalle 00,10 alle 05,00
3 Interruzioni puntuali: p.m.
4 Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5 Variazioni di Orario No standard: p.m.
6 Variazioni fascia: p.m.
7 Notte > 8h: p.m.

[Handwritten signature]

2 BO-MI AV/AC: Montaggio sospensioni TE "OMNIA" 25 kV
1 Descrizione attività: Installazione sospensioni TE "OMNIA" ambito PM Campagne della linea Bologna - Milano AV/AC
Periodo di lavorazione: 15 maggio - 26 luglio 2026
Impegno di personale: - UMTE: 3/4 AM
2 Interruzioni notturne: da L/M a G/V dalle 23,50 alle 05,00
3 Interruzioni puntuali: p.m.
4 Interruzioni weekend/festivi: V/S dalle 23,50 alle 05,00
5 Variazioni di Orario No standard: p.m.
6 Variazioni fascia: p.m.
7 Notte > 8h: p.m.

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/2

3 BO-MI AV/AC: Manutenzione linea di contatto con ditte

1	Descrizione attività: Manutenzione e revisioni LdC ambito giurisdizione UMTTE AV
	Periodo di lavorazione: 01 aprile - 15 maggio 2026
	Impegno di personale: - UMTTE: 2/3 AM
2	Interruzioni notturne: da L/M a G/V dalle 23,50 alle 05,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: V/S dalle 23,50 alle 05,00
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.

4 BO-MI AV/AC: Diserbo chimico con ditte

1	Descrizione attività: Attività di diserbo piante infestanti della linea Bologna - Milano AV/AC
	Periodo di lavorazione: aprile - maggio 2026
	Impegno di personale: - UMTTE: 1 AM
2	Interruzioni notturne: D/L dalle ore 00,10 alle 05,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: V/S e S/D dalle ore 00,10 alle 05,00
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/3

5 MO-VR: Rinnovo binari di tratta e località tra Rolo Novi e Suzzara

1	Descrizione attività: Riordamento binari di tratta e di località tra Rolo Novi e Suzzara della linea convenzionale Modena - Verona
	Periodo di lavorazione: 30 marzo - 31 luglio 2026
	Impegno di personale: - UML/V: 5/7 AM - UMI/S: 3/4 AM - UMTTE: 3/4 AM
2	Interruzioni notturne: da L/M a G/V dalle ore 23,00 alle 05,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: V/S dalle ore 23,00 alle 05,00
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.

6 BO-PC: Inalزامmento H.55 marciapiede II e alla pensilina della stazione di Rubiera (preferenza DST)

1	Descrizione attività: Inalزامmento H.55 del II marciapiede della stazione di Rubiera della linea convenzionale Bologna – Piacenza
	Periodo di lavorazione: 18 aprile - 22 luglio 2026
	Impegno di personale: - UML/V: 1/2 AM - UMTTE: 2 AM
2	Interruzioni notturne: dal 18/04 al 22/07 interruzioni binario dispari D/I, L/M, M/M dalle 00,30 alle 04,30
3	Interruzioni puntuali: dal 18/04 al 22/07 interruzioni binario II (primisesso) tutti i giorni dalle 14,00 alle 04,30 o 08,00
4	Interruzioni weekend/festivi: dal 18/04 al 22/07 interruzioni binario dispari S/D dalle 00,30 alle 04,30
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/4

7 BO-PC: Rinnovo binario I est in località Fiorenzuola

1	Descrizione attività: Rinnovo binario I est in località Fiorenzuola della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: 20 aprile - 09 maggio 2026
	Impegno di personale: - UMDV: 3/4 AM - UMTTE: 3 AM - UMIS: 2/3 AM
2	Interruzioni notturne: da L/M a G/V dalle ore 00,00 alle 05,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: V/S dall'ore 00,00 alle 05,00
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.

8 BO-PC: Rinnovo binario VI, binari Carbonara e Rimessa in località Fidenza

1	Descrizione attività: Ritamento binari VI, I-II Carbonara e I-II Rimessa in località Fidenza della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: 18 maggio - 01 giugno 2026, 08 giugno - 10 luglio 2026
	Impegno di personale: - UMDV: 3/4 AM - UMTTE: 3 AM - UMDS: 2/3 AM
2	Interruzioni notturne: dal 18/05 al 30/05 interruzioni binari VII e VIII da L/M a G/V della durata di 5h
3	Interruzioni puntuali: - interruzione continuativa del VI binario dalle 08:00 del 18/05 alle 16:00 del 01/06; - binari carbonara e rimessa, interruzione continuativa dalle 08:00 del 08/06 alle 16:00 del 10/07
4	Interruzioni weekend/festivi: dal 18/05 al 30/05 interruzioni binari VII e VIII V/S della durata di 5h
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/5

9 BO-PC: Realizzazione barriere fonoassorbenti tratta Parma-S.Iario (referenza DINV)	
1	Descrizione attività: Realizzazione barriere fonoassorbenti lungo la tratta Parma - S.Iario della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: 11 marzo / 16 novembre 2026
	Impegno di personale: - UMTE: 2 AM
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V dalle ore 00,00 alle 04,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

10 BO-PC: Adeguamento a standard 270 mmq della linea di contatto dei binari merci in località Parma	
1	Descrizione attività: Lavori di adeguamento allo standard della LdC a 270 mmq della infrastruttura TTE dei binari merci in località Parma della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: 15 giugno - 17 luglio 2026
	Impegno di personale: - UMTE: 4 AM
2	Interruzioni notturne: da D/L a M/M della settimana successiva - interruzione di 4,30h
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/6

11 BO-PC: Rinnovo deviatoio 13B in località Fidenza

1	Descrizione attività: Rinnovo deviatoio 13B nella località di Fidenza della linea convenzionale Bologna – Piacenza
	Periodo di lavorazione: 10 maggio - 13 maggio 2026
	Impegno di personale: - UDDV: 4/5 AM - UMIS: 3/4 AM - UNLTV: 3 AMI
2	Interruzioni notturne: da D/L a M/M con interruzioni della durata di 5h
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

12 BO-PC: Regolazione LRS serraglie con ditte

1	Descrizione attività: Regolazione lunga rotaria saldata serraglie in località varie della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: 09 giugno - 10 luglio 2026
	Impegno di personale: - UNLTV: 3/4 AMI
2	Interruzioni notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali: n. 20 interruzioni programmate diurne dal 09 al 12 giugno, dal 15 al 19 giugno, dal 22 al 23 giugno, dal 30 giugno al 03 luglio, dal 06 luglio al 10 luglio dalle 09:30 alle 12:30
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/7

13 BO-PC: Sostituzione GII/Eliminazione difetti e saldature difettose con ditte località varie

1	Descrizione attività: Eliminazione saldature difettose della linea convenzionale Bologna – Piacenza
	Periodo di lavorazione: marzo - giugno 2026
	Impegno di personale: - UMLV: 3/4 AM
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V con interruzioni della durata di 3/4 ore
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Nocti > 8h: p.m.

14 BO-PC: Diserbo chimico tratte varie

1	Descrizione attività: Attività di diserbo piante infestanti della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: aprile - maggio 2026
	Impegno di personale: - UMLV: 1 AM
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V con interruzioni della durata di 3/4 ore
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Nocti > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività UTEM: dettagli attività MAG-GIU 2026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15 BO-PC: Rinnovo deviatoi 19A, intersezione scalo est, 18A/18B, 16B, 16A e 18B/17 ambito Parma

1	Descrizione attività: Rinnovamento deviatori 19A, intersezione scalo est, 18A/18B, 16B, 16A e 18B/17 in località Parma della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: 08 giugno - 27 giugno 2026
	Impegno di personale: - UMLEV: 5 AMI - UMTTE: 3/4 AMI - UMIS: 4 AMI
2	Interruzioni notturne: da L/M a G/V con interruzioni notturne durata di 4/5h
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: - V/S con interruzione notturna della durata di 4/5 h; - interruzione continuativa dalle 22:00 del 19/06 al 05:00 del 22/06
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: Domenica 21/06 MI diventa M o P
7	Notte > 8h: p.m.

[Handwritten signature]

16 BO-PC: Livellamento sistemato con ditte

1	Descrizione attività: Livellamento sistemato con ditte per adeguamenti piano-altimetrici del binario compreso il riporto della massicciata della linea convenzionale Bologna - Piacenza
	Periodo di lavorazione: aprile - giugno 2026
	Impegno di personale: - UMLEV: 3 AMI
2	Interruzioni notturne: da D/L a G/V con interruzioni notturne della durata di 3/4h
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DOIT Bologna

PdA UTRO

maggio-giugno 2026



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – UT Romagna


Piano di Attività DOIT: GEN-DIC 2026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anno 2026

Ore Capacità Cdl	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Correttiva	Preventiva Ciclica	On-Condition	Altre Attività	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internalizzata	Manutenzione Straordinaria	
434.921,10	15.678,96	107.884,83	76.866,99	4.040,76	36.852,04	25.369,58	95.109,90	61.202,80	423.005,86
n° Notte	659	1765	2410	105	26	0	1392	3054	9411

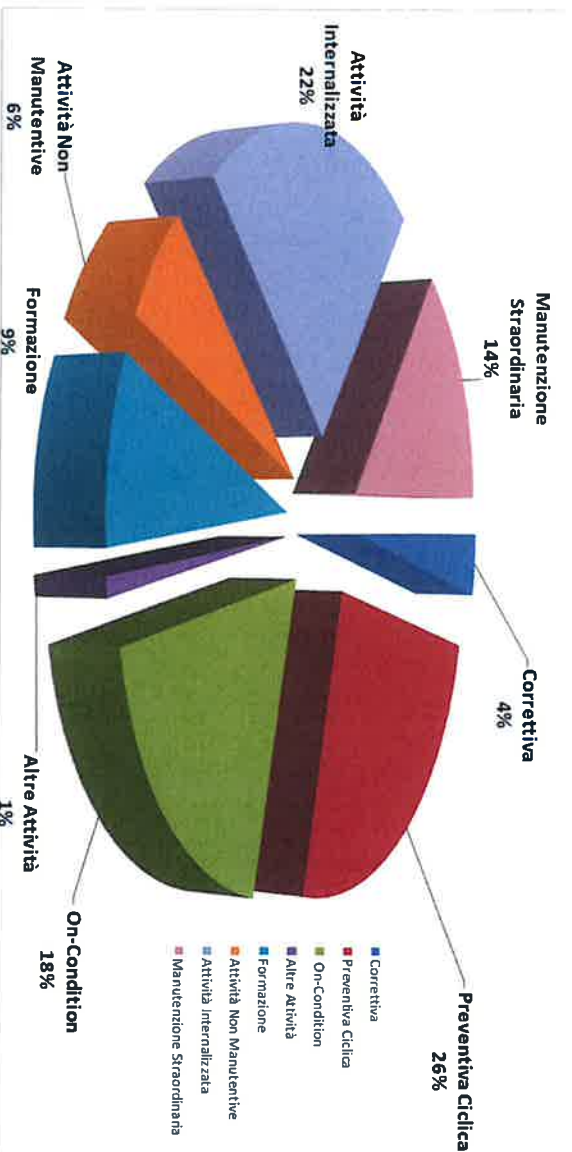

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTEM: MAG-GIU 2026


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anno 2026 mag-giu

Ore Capacità CDL	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Correttiva	Preventiva Ciclica	On-Condition	Altre Attività	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internalizzata	Manutenzione Straordinaria	
72.486,85	2.613,16	17.980,80	12.811,16	673,46	6.142,00	4.228,26	15.851,65	10.200,46	70.500,95
n.° Notte	110	294	401	18	4	0	232	509	1568

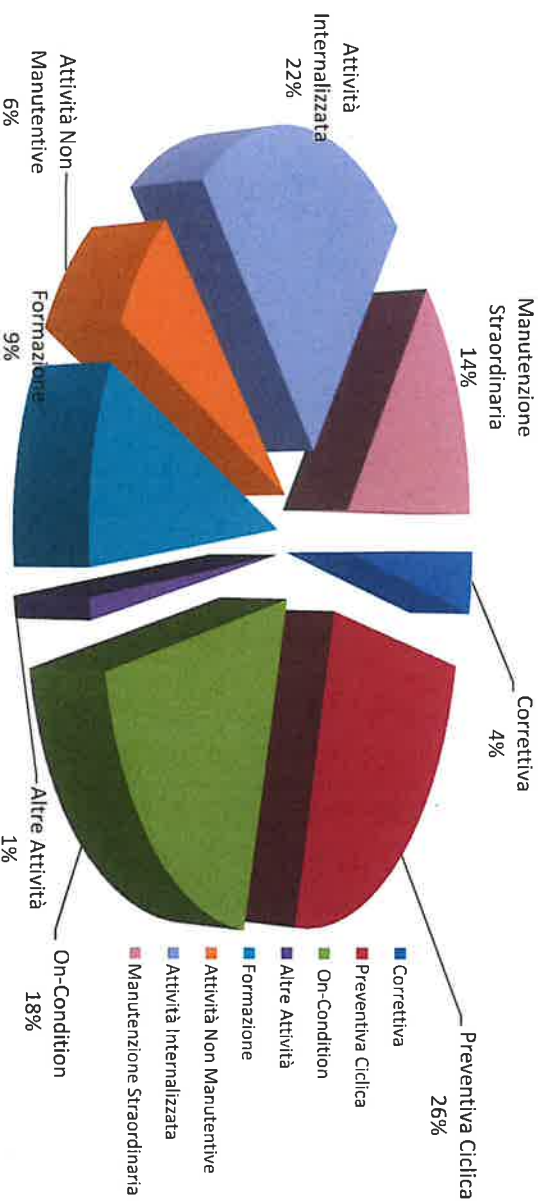

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTEM: MAG-GIU 2026

n°	Località/Tratta	Linea	Descrizione attività	Appaltatore
1	Bologna Interporto	BO-PD	Rinnovamento Deviatori	CLF
2	Ferrara	BO-PD	Rinnovamento Deviatori	CLF
3	Ferrara	BO-PD	Rinnovamento massicciata asta copparo	CLF
4	Ferrara	BO-PD	Rinnovamento massicciata binario VII	CLF
5	Ferrara	BO-PD	Rinnovamento componenti deviatore	CLF
6	Ferrara	BO-PD	Rinnovamento deviatore	CLF
7	S. Pietro in Casale e Ferrara	BO-PD	Regolazione serraglie	CLF
8	Occhiobello	BO-PD	Rinnovo impianti RED	SIELTE
9	Bologna Interporto	BO-PD	Rinnovamento binario VIII	CLF
10	Poggio Rusco	BO-VR	Realizzazione tronco sezionamento	GCF
11	Poggio Rusco	BO-VR	Regolazione serraglie	CLF
12	Pesiceto Nord	BO-VR	Regolazione serraglie	CLF
13	Imola	BO-RN	Regolazione serraglie	CLF
14	Rimini	BO-RN	Regolazione serraglie	CLF
15	Igea Marina	RA-RN	Revamping pensiline	Railway
16	Lido di Classe	RA-RN	Revamping pensiline	Railway
17	Ravenna	FE-RN	Regolazione serraglie	CLF
18	Cervia - Portomaggiore-Mezzano	FE-RN	Regolazione serraglie	CLF

Bozz

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTRC - dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/1

1 BO-PD Rinnovo Deviatoi Bologna Interporto

1	Descrizione Attività: Rinnovo deviatoi n° 38A - 38B - 109 a Bologna interporto
	Periodo di lavorazione: 22 aprile - 6 maggio 2026
	Impegno personale: 4/5 UM LV; 3/4 UM IS; 3 UM TE;
2	Interruzioni Notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali Diurne: Interruzioni diurne dal lunedì al venerdì della durata di circa 3 ore nella fascia oraria dalle 08:00 alle 16:00
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: S; il turno M o P potrebbe diventare M1
7	Notte > 8h: p.m.

2 BO-PD: Rinnovo deviatoi

1	Descrizione Attività: Rinnovo dev. 19A a Ferrara
	Periodo di lavorazione: 11 maggio - 13 maggio 2026
	Impegno personale: 4/5 UM LV; 3/4 UM IS; 3 UM TE;
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 23:30 alla 04:30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTRO: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/2

3 BO-PD Rinnovoamento massicciata
1 Descrizione Attività: Rinnovoamento con risanamento della massicciata del binario i, tratto dal dev. 19a al paraurti "asta copparo" della stazione di Ferrara
Periodo di lavorazione: 13 maggio - 03 giugno 2026
Impegno personale: 5/6 UM LV; 3/4 UM IS; 3 UM TE;
2 Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 04.30
3 Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4 Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5 Variazioni di Orario No standard: p.m.
6 Variazioni fascia: p.m.
7 Notti > 8h: p.m.

4 BO-PD: Rinnovoamento massicciata
1 Descrizione Attività: Rinnovoamento con risanamento della massicciata del binario VII nella stazione di Ferrara
Periodo di lavorazione: 04 giugno - 16 giugno 2026
Impegno personale: 5/6 UM LV; 3/4 UM IS; 3 UM TE;
2 Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 04.30
3 Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4 Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5 Variazioni di Orario No standard: p.m.
6 Variazioni fascia: p.m.
7 Notti > 8h: p.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Series of handwritten signatures]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTR0: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/3

5 BO-PD: Rinnovo componenti di deviatori

1	Descrizione Attività: Rinnovo semi-telaio n°5a/9a e sostituzione coppia a/c deviatorio n° 4a nella stazione di Ferrara
Periodo di lavorazione: 16 giugno – 18 giugno e notte 22/23 giugno 2026	
Impegno personale: 4/5 UM LV; 3/4 UM TS; 3 UM TE;	
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 04.30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Nocti > 8h: p.m.

6 BO-PD: Rinnovo deviatori

1	Descrizione Attività: Rinnovo deviatorio n° 16a nella stazione di Ferrara
Periodo di lavorazione: 18 giugno - 20 giugno 2026	
Impegno personale: 4/5 UMLV; 3/4 UM TS; 3 UM TE;	
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 04.30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Nocti > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTR0: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/4

7 BO-PD: Regolazione Serraglie

1	Descrizione Attività: Regolazioni serraglie a temperatura naturale stazioni di San Pietro in Casale e Ferrara
	Periodo di lavorazione: 09 giugno 2026 – S. Pietro in Casale 10 giugno 2026 – Ferrara
	Impegno personale: 3/4 UMLV;
2	Interruzioni Notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali Diurne: Interruzioni lunedì e martedì diurne nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

8 BO-PD: Rinnovo impianti RED

1	Descrizione Attività: Rinnovo impianti RED nella stazione di Occhiobello
	Periodo di lavorazione: 22 giugno - 27 giugno 2026
	Impegno personale: 2/3 UMLTS;
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 04.30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTRO: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/5

9	BO-PD: Rinnovo bin VII Bo Interporto
1	Descrizione Attività: Rinnovamento con risanamento della massicciata del binario VII fascio base nella stazione di Bologna Interporto
	Periodo di lavorazione: 25 giugno – 10 luglio 2026
	Impegno personale: 5/6 UMLV; 3/4 UM IS; 3 UM TTE;
2	Interruzioni Notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali Diurne: Interruzioni diurne dal lunedì al venerdì della durata di circa 3 ore nella fascia oraria dalle 08:00 alle 16:00
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: S; il turno N o P potrebbe diventare M1
7	Noti>8h: p.m.
10	BO-PD: Realizzazione Tronco di sezionamento
1	Descrizione Attività: Realizzazione nuovo tronco di sezionamento TTE (app. 1a) nella stazione di Poggio Renatico; Attività TTE conto DINV propedeutica all'attivazione dell'ACCM Occhiobello (f) – S. Pietro in C. (e)
	Periodo di lavorazione: 20 giugno – 22 giugno 2026
	Impegno personale: 3/4 UM TTE;
2	Interruzioni Notturne: dom/lan dalle 22.30 alle 06.30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: Interruzioni notturne sab/dom dalle 22.30 alle 06.30
5	Variazioni di Orario No standard: S; prolungamento orario
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Noti>8h: S

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTR0: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/6

11 BO-VR: Regolazione Serraglie
1) Descrizione Attività: Regolazioni serraglie a temperatura naturale nella Stazione Poggio Rusco
Periodo di lavorazione: 24 giugno - 03 luglio 2026
Impegno personale: 3/4 UMLV,
2) Interruzioni Notturne: p.m
3) Interruzioni puntuali Diurne: Interruzioni infrasettimanali diurne nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4) Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5) Variazioni di Orario No standard: p.m.
6) Variazioni fascia: p.m.
7) Notte > 8h: p.m.

12 BO-VR: Regolazione Serraglie
1) Descrizione Attività: Regolazioni serraglie a temperatura naturale nella Stazione di PC Persiceto Nord
Periodo di lavorazione: 01 luglio 2026
Impegno personale: 3/4 UMLV,
2) Interruzioni Notturne: p.m.
3) Interruzioni puntuali Diurne: Interruzione diurna nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4) Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5) Variazioni di Orario No standard: p.m.
6) Variazioni fascia: p.m.
7) Notte > 8h: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTR0 - dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/7

13 BO-RN: Regolazione Serraglie

1	Descrizione Attività: Regolazioni a temperatura naturale nella Stazione di Imola della serraglia tra i deviatori 3b-1°
	Periodo di lavorazione: 03 giugno 2026
	Impegno personale: 3/4 UM LV;
2	Interruzioni Notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali Diurne: Interruzione diurna nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

14 BO-RN: Regolazione Serraglie

1	Descrizione Attività: Regolazioni a temperatura naturale nella Stazione di Rimini delle serraglie tra i deviatori 7b-25b e 18b-8a (binario dispari), 8b-12b (binario pari)
	Periodo di lavorazione: 03 giugno 2026
	Impegno personale: 3/4 UM LV;
2	Interruzioni Notturne: p.m.
3	Interruzioni puntuali Diurne: Interruzione diurna nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.



DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTR0 - dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/8

15 RA-RN: Revamping Pensiline

1	Descrizione Attività: Revamping tertioia PV e asfaltatura parte h 25 del 1° marciapiede nella stazione di Igea Marina
	Periodo di lavorazione: 20 maggio - 12 giugno 2026
	Impegno personale: 2/3 UM TE;
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni da dom/lan a gio/ven dalle 23.30 alle 04.30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.

16 RA-RN: Revamping Pensiline

1	Descrizione Attività: Rifacimento pensilina ed illuminazione del 1° marciapiede nella stazione di Classe/Savio
	Periodo di lavorazione: 29 aprile - 19 maggio 2026
	Impegno personale: 2/3 UM TE;
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni da dom/lan a gio/ven dalle 23.30 alle 04.30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notte > 8h: p.m.



DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività UTRO: dettagli attività MAG-GIU 2026

Cantieri Mag-Giu 2026/9

17 FE-RN: Regolazione Serraglie

1 Descrizione Attività: Regolazioni a temperatura naturale nella Stazione di Ravenna delle serraglie tra i deviatori 32a - 37a, 22b/21a - 41b, 49b - 51b, 37a - 38a e 38a - 22b/21a Periodo di lavorazione: 11 giugno - 17 giugno 2026 Impegno personale: 3/4 UM LV;
2 Interruzioni Notturne: p.m.
3 Interruzioni puntuali Diurne: Interruzioni intrasettimanali diurne nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4 Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5 Variazioni di Orario No standard: p.m.
6 Variazioni fascia: p.m.
7 Notti >8h: p.m.

18 FE-RN: Regolazione Serraglie

1 Descrizione Attività: Regolazioni a temperatura naturale nelle Stazioni di Mezzano, Portomaggiore e Cervia delle serraglie tra i deviatori 1-3a (Mezzano), 1-3b (Cervia), 3b-5b e 2a-102b (Portomaggiore) Periodo di lavorazione: 18 giugno 2026 - Cervia 19 giugno 2026 - Mezzano 22-23 giugno 2026 - Portomaggiore Impegno personale: 3/4 UM LV;
2 Interruzioni Notturne: p.m.
3 Interruzioni puntuali Diurne: Interruzioni diurne nella fascia dalle 8.00 alle 13.00
4 Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5 Variazioni di Orario No standard: p.m.
6 Variazioni fascia: p.m.
7 Notti >8h: p.m.

CS

AS

AS


ML

DOIT Bologna – MAI

Piano di Attività DOIT- MAG- GIU 2026

Anno 2026

One Capacity Cdl	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBRISOGNO
	Correttiva	Preventiva Ciclica	On-Condition	Altre Attività	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internalizzata	Manutenzione Straordinaria	
84.810	2.704	1.060	27.210	55	17.668	4.648	29.036	2.000	84.380
n° Nodi	13	68	1378	24	27	0	1398	0	2908

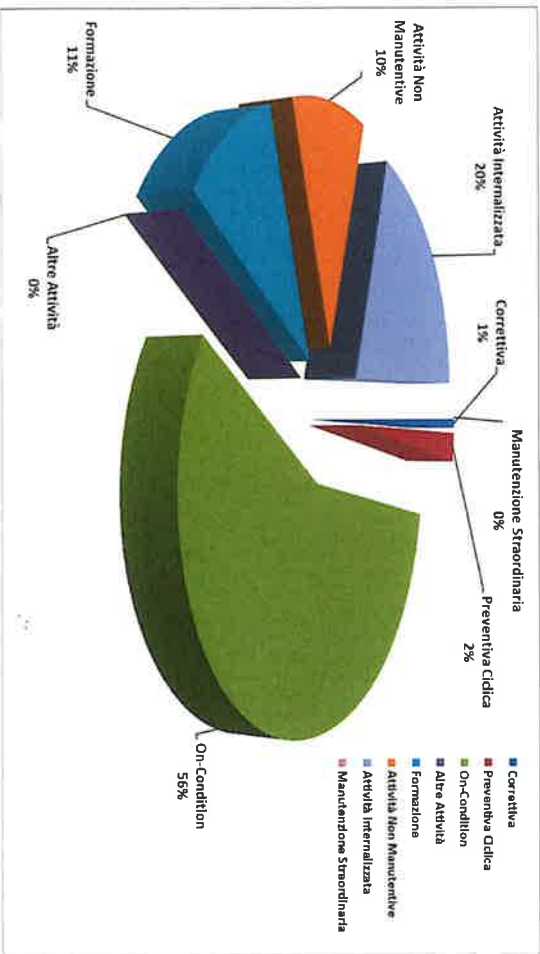

P



Boelli

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DOIT Bologna – MAI

Piano di Attività DOIT: MAG- GIU 2026


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mag-giu anno 2026

Ore Capacità cdi	MANUTENZIONE ORDINARIA			ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBRICAZIONE	
	Correttiva	Preventiva Ciclica	Or-Condition	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internazionalizzata	Manutenzione Straordinaria		
51.143	1.708	12.909	9.887	258	6.572	3.285	13.189	2.613	50.421
n.° Notte	11	194	381	10	0	1	427	60	1084

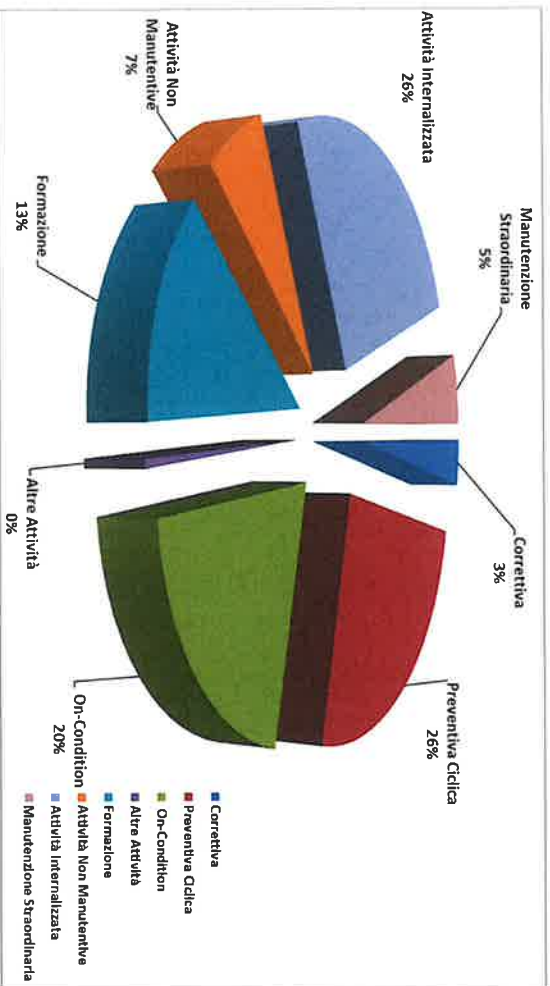

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOIT Bologna – MAI-CMA

Piano di Attività DOIT: MAG-GIU 2026

TIPLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026				
			ore	nott	mag	giu	
Correttiva	100	Attività svolte per la riparazione dei guasti	396	2	191	205	
Civica	211	Visite di focalità e uscita Atte Visite, ispezioni, verifiche e misure al tipo sistem previste da regolamenti FS Attività di manutenzione di tipo civico previste da regolamenti FS	267	17	30	337	
	212	Attività di manutenzione: il tipo civile previsto da regolamenti FS	-	-	-	-	
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive: assistenza e seguito di visita, misure, riparazioni, interventi da sistemi di trazione, diagnosi (vedere MA, ER, Ego, Macchi, CCE o P27), MAN, e interventi esterni che non fanno parte del Guast	3.274	230	1.011	1.053	
Obbl. di Legge	240	Attività in merito a tutti i decreti, norme e circari in vigore dello stesso	2	-	1	1	
Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'efficienza dell'impianto	8	4	8	-	
Att. Produzione	400	Attività implementate in conto di Co. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-	
Formazione	500	Attività di formazione	4.158	-	2.231	1.977	
Attività non man.	600	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività manutent.	704	-	318	386	
Conto Terzi	700-720-730-81-20	Attività svolte per dare assistenza a terzi (sb. in conto terzi)	-	-	-	-	
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'urgenza (finanz. da ordine interno)	-	-	-	-	
Diag. Nazionale	900	Attività legate alle diagnosi nazionali (veicoli TALETE, ASSICURAZIONE ALCELANOVA, ...)	-	-	-	-	
Interventi a Progetto		Lavori intermodali relativi al Ferrovietto, Tecnologie, miglioramento binari e servizi, cambio filo linea di comando, ridimensionamento apparecchiature Lavori RISA e scorie altri lavori di utilia - Altri Lavori in MS - Scenariò Temo e altre in SO	4.940	233	2.420	2.420	
	NTW						
TOT NTW			4.940		2.420	2.420	
Totale ore Fabbisogno			13.749	486	6.810	6.938	
Totale ore Capacità (2)			14.816		7.068	7.068	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DOIT Bologna – MAI-IG

Piano di Attività DOIT- MAG- GIU 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	pianificate 2026				
			giu	mag	nott	giu	giu
M.O. (infr. E Mezzi)	Correttiva	Attività svolte per la riparazione dei guasti	123	2	23	100	
	Ciclica	211	Visite, ispezioni, verifiche e misure di tipo di tipo prelievi da regolamenti FS	317	31	49	289
		212	Attività di manutenzione di tipo ad hoc previste da regolamenti FS	729	58	94	635
	On Condizion	221-222	Attività di manutenzione di tipo ad hoc previste da regolamenti FS	36	46	-	38
		231-232	Attività di manutenzione di tipo ad hoc previste da regolamenti FS	-	-	-	-
	Obbl. di Legge	240	Attività di manutenzione di tipo ad hoc previste da regolamenti FS	487	8	276	211
	Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto	8	-	-	8
	Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in conto M. O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-
	Formazione	500	Attività di formazione	1.292	775	517	-
	Attività non man.	600	Attività che non hanno aderenza con una specifica attività manutentiva	192	-	44	148
Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi o in conto terzi	-	-	-	-	
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'urgenza finanziati da ordinari interni	-	-	-	-	
	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (verbi e TALETE Roma)	-	-	-	-	
Diag. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (verbi e TALETE Roma)	937	62	610	327	
Interventi a Progetto	Lavori internalizzati di competenza – Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità – Altri Lavori in MS – Scenari Tecnico e altre MSO	NTW	TOT NTW				327
			Totale ore Fabbisogno				4.121
Totale ore Capex(42)			4.993	2442	2442	2442	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DOIT Bologna – MAI-TLC

Plano di Attività DOIT- MAG- GIU 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notte	mag	giu	
M.O. (infr. E Mezzi)	Correttiva	100	572	4	150	422	
	Ciclica	211	1.827	13	794	833	
		212	1.544	4	814	730	
	On Condition	221-222 231-232	3.224	45	1.874	1.350	
	Obbl. di Legge	240	1	-	-	1	
	Migliorativa	300	-	6	-	-	
	Att. Produzione	400	12	-	12	-	
	Formazione	500	487	-	278	209	
	Attività non man.	600	820	-	439	381	
	Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività a volte per dare assistenza a terzi e/o in conto terzi	29	1	29	-
Prest. Varie	Interv. Urgenza	800	-	-	-	-	
	Diag. Nazionale	900	-	-	-	-	
	Interventi a Progetto	Lavori internalizzati di competenza – Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità – Altri Lavori in MS – Scenario Tecnico e altre MSO	NTW	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
-				-	-	-	
-				-	-	-	
TOT NTW			5.203	-	2.705	2.498	
Totale ore Fabbisogno			13.519	118	7.094	6.425	
Totale ore Capacità (2)			13.107	-	6.554	6.554	

DOIT Bologna – MAI-SSE

Piano di Attività DOIT- MAG- GIU 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notti	mag	giu
Correttive	100	Attività svolte per la riparazione dei guasti	617	3	317	300
Cidrica	211	Verifica di uscite e parti Altro: visite, ispezioni, verifiche e misure di tipo ciclico previste da regolamenti FS Attività di manutenzione di tipo ciclico previste dai regolamenti FS	3.428	28	1.851	1.577
	212	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste dai regolamenti FS	2.923	5	1.797	1.126
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive eseguite a seguito di visita, misure, segnalazioni pervenute da sistemi di rivelazioni diagnostiche (veicolo TALETO ARCHIMEDE o PVR, MAIA) e fenomeni esterni che non hanno causato guasti	2.617	17	1.115	1.502
Obbl. di Legge	240	Attività manutentive di verifica e misure imposte da leggi dello Stato	256	-	169	89
Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto	231	-	231	-
Art. Produzione	400	Attività implementate in conto M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-
Formazione	500	Attività di formazione	315	-	173	142
Attività non man.	600	Attività che non hanno affinenza con una specifica attività manutentiva	726	-	363	364
Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi (o in conto terzi) vari	-	-	-	-
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'urgenza (finanz. da ordine interno)	-	-	-	-
Diagn. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (veicolo TALETO ARCHIMEDE, ALDEBARAN, ...)	-	-	-	-
Interventi a Progetto	Lavori internalizzati di competenza - Lavori MSA e scorte albi - Lavori di utilla - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	Lavori internalizzati relativi ad Armeamento, Tecnologie, Invelemento binari e deviazioni, cambio filo linea di contatto, ridassamento apparecchiature	2.641	45	1.337	1.305
		Lavori TALETO e scorte altri lavori di utilla - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	274	5	137	137
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
TOTALE NTW			2.915	-	1.474	1.442
Totale ore Fabbisogno			14.031	103	7.489	6.542
Totale ore Capacità (2)			13.878	-	6.939	6.939

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin]
