

**VERBALE DI ACCORDO fra RFI SpA – DIREZIONE OPERATIVA
INFRASTRUTTURE – DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE
TERRITORIALE BOLOGNA unitamente alla S.O. DRUO-Risorse Umane BO-FI e la
Segreteria Regionale Emilia-Romagna della Organizzazione Sindacale FAST Confsal ed
RSU 7 Bologna - Collegi: Ingegneria e Tecnologie - Infrastruttura UT Bologna Nodo -
Infrastruttura UT Emilia - Infrastruttura UT Romagna**

Addì 09 ottobre 2026

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo Nazionale del 10/01/2024 e dall'Accordo Territoriale del 26/11/2025, dopo un'ampia e approfondita analisi delle esigenze produttive della DOIT di Bologna riferite al periodo 01 novembre 2026 - 28 febbraio 2027, concordano le modalità esposte negli allegati al presente verbale.

Per finalizzare l'insieme di tutte le attività manutentive pianificate e alla luce dell'allocazione delle interruzioni riferibili alle lavorazioni indicate, è stato effettuato uno studio volto all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale concentrandolo quanto più possibile in turni sovrapponibili ai citati spazi manutentivi, attraverso una eventuale rimodulazione delle fasce e potenziando, in tal modo, le consistenze delle squadre per tragguardare la produttività nel rispetto delle tempistiche attese e il riequilibrio dei carichi di lavoro.

Pertanto, confermando come lo sviluppo e la cadenza del turno di lavoro applicato nella DOIT di Bologna, sia quello definito dall'accordo territoriale del 26/11/2025, in coerenza con quanto previsto al punto H dell'Accordo Nazionale del 10/01/2024 per le specifiche lavorazioni indicate nei prospetti allegati, le parti concordano di applicare l'indicazione contenuta negli stessi.

In particolare, in seguito alla presentazione dei PdA relativi al quadrimestre 01 novembre 2026 - 28 febbraio 2027 le parti concordano sulle modifiche presenti in relazione a:

1. Alle attività di cui ai punti n° 1, 9, 10, 12 e 13 dell'UT Bologna Nodo;
2. Alle attività di cui al punto n° 7 e 8 dell'UT Emilia;
3. Alle attività di cui ai punti n° 2, 16, 18, 19, 20, 21 dell'UT Romagna.

Resta ferma, ai fini della corresponsione delle indennità previste dal punto G comma 9.b dell'Accordo Nazionale, la conferma e la piena validità del turno pianificato riportato nell'accordo territoriale del 26/11/2025.

A seguito di richiesta da parte sindacale, la Società informa che:

1. In data 01 ottobre 2026 sono stati assunti n° 21 OSMI IE-LV "Senior";
2. È in corso l'iter selettivo per l'assunzione da mercato di OSMI IE-LV "Junior", che sarà finalizzato entro il corrente anno;
3. La copertura delle posizioni da CT spec IS-TE-LV per il territorio della DOIT di Bologna è prevista per il 01 novembre 2026; mentre per i TEC spec IS-TE-LV è prevista per il 01 dicembre 2026. Al contempo la Società comunica che saranno avviate le verifiche per la copertura di analoghe posizioni delle strutture del MAI, a valle delle quali saranno avviate le relative procedure selettive interne;
4. Sono state individuate le risorse per la copertura delle posizioni di operatore CT DOTE e inviate ai previsti percorsi formativi/abilitativi;

5. La DOIT è interessata dall'internalizzazione di attività di competenza delle UT nonché del MAI.


Si ribadisce l'obiettivo comune delle parti di condividere misure che possano agevolare la conciliazione di vita e lavoro, anche confermando l'impegno preso dalla Società nell'accordo del 26 novembre 2025 di non pianificare attività di manutenzione ordinaria nei giorni festivi di cui all'art. 29 punto 2.1 del CCNL e nello specifico del quadrimestre in oggetto del presente accordo non sono previste attività di manutenzione straordinaria ad eccezione delle attività sopra citate.

Entro la fine del corrente anno verrà effettuato un incontro in cui l'Azienda rappresenterà gli indici più indicativi in merito all'Accordo territoriale del 26/11/2025.


Per RFI S.p.A

per le OO.SS.

RSU 7

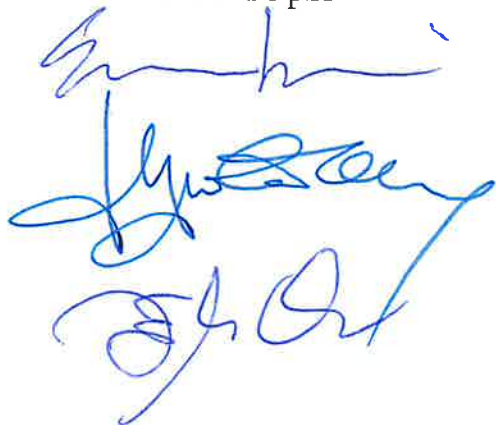

FAST CONFESAL



Piani di Attività UT Bologna Nodo

Novembre 2026 – Febbraio 2027

[Handwritten signatures and initials]

UNITA' TERRITORIALE BOLOGNA NODO

Programmi Attività quadrimestre Novembre 2026-Febbraio 2027

n°	Località/Tratta	Descrizione attività	Area	Impresa
1	Prato Prato	PCBU	Bologna-Prato	Leopini - Notari - GCF
2	S. Giulietto V. S. Viciano	Prato Lajuri in GGA	Bologna-Prato	Leopini - Notari - GCF
3	Pianoro - Bertinotto V. S.	Interventi TE - Sostituzione segnali di tratta tra le stazioni di Pianoro e Monturo	Bologna-Prato	GCF - Serbelli/Elfin
4	BO PO	Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto - Sostituzione casse induttori in stazione di San Ruffino	Bologna-Prato	GCF - Serbelli/Elfin
5	BO PD	Sostituzione A/C dev 5 Monturoquiere dev. 3b Vercelli, Lione dev. 2 S. Benenotto	Bologna-Prato	GCF
6	BO PI	Attività di sostituzione FIAPL parallelo km 122+376 e Pista km 15+217	Bologna-Pistoia	Serbelli - Marmiro
7	Casalecchio V.	Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto	Bologna-Pistoia	GCF
8	Pistoia-Vallombrosa	Attività di sostituzione FIAPL km 37+179	Bologna-Pistoia	Serbelli - Marmiro
9	Piazzale Armadori	Rimozione 5 deviatori	Nodo di Bologna	GCF
10	Bologna Ravenna	Rimozione 9 deviatori	Nodo di Bologna	GCF
11	S. Vitale	Rimozione 3 deviatori	Nodo di Bologna	GCF
12	Bologna Ravenna	Rifacimento guardrail di	Nodo di Bologna	Assalini
13	Castura	Rimozione TE Bologna Firenze - Donato	Castura	GCF
14	Lavino C. Franco	Lavino C. Franco - Rimozione TE bracci Dispositivi Fari	BO-PC	GCF
15	Bologna C.le	Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto	Nodo di Bologna	GCF
16	BO MI AV	Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto varie tratte	BO-MI AV	GCF
17	Bologna C.le	Consolidamento cassa laterale di Via Matteotti km 90+728	Nodo di Bologna	Serbelli
18	Bologna C.le S. Vitale	Impermeabilizzazione ponte via Moschetti km 3+342	BO-BN	Serbelli - GCF
19	Bologna C.le S. Vitale	Sostituzione tubi binario pari all km 1+200 all km 2+050	BO-PN	GCF
20	Bologna PC - C. Franco Est	Bologna PC - C. Franco Est posa nuova linea	BO-MI AV	GCF - Assalini
21	Bretella AP Venezia	Attività di snella monostrada per realizzazione del nuovo canale di scarico delle acque meteoriche verso il Fiume Reno, al km 2+256	BO-MI AV	FE S.r.l., Zm. Elco S.r.l. e GEF S.p.A.
22	BO FI AV	Sostituzione di tutte le taglie della linea	BO-FI AV	GCF
23	BO FI AV	Impermeabilizzazione di vari tratti delle gallerie Magli - Rattiosa e Frenziosa	BO-FI AV	Topini
24	BO FI AV-BU MI AV	Attività di livellamento sistemico sulla BO-FI AV e di 2° livello sulla BO-MI AV	BO-FI AV-BU-MI AV	GCF
25	PM Reno PM Anzola	Molatura delle rotaie	BO-MI AV	GCF
26	Bologna C.le Av. S. Emilia	Sostituzione rotaie binario l'androne dal POC Savena al km 91+200	BO-FI AV	GCF
27	Grizzana Moruno	Impermeabilizzazione ponte km 65+973	Bologna-Prato	GCF
28	S. Ruffino	Rimozione campate dei 1° binario	Bologna-Prato	GCF

1 Cepini - Notari - GCF: Pianoro-Prato-PC80

1	Descrizione attività: Opere necessarie a ottenere l'adeguamento gallerie a sagoma PC/80 della linea Prato - Bologna
	Periodo di lavorazione: da Gennaio 2027 a fine Aprile 2027
	Impegno di personale - UMLV2: 6/8 - UMIS2: 6/8 - UMTT2: 6/7
2	Interruzioni notturne: No
3	Interruzioni puntuali Diurne: - Interruzioni diurne dal lunedì al venerdì dal 11/01 al 29/04/07 dalle 9,30 alle 13,30.
4	Interruzioni weekend/festivi: SI 30/31 gen, 20/21 feb, 27/28 feb, 06/07 mar, 20/21 mar dalle ore 9,30 del sabato alle 16,30 della domenica
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: per le interruzioni diurne necessità di incrementare il turno del mattino (MI 8,00-15,36) rinunciando a prestazioni notturne o pomeridiane per LV ed IS con possibile sussidio da UM limitrofe
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No

2 Cepini - Notari - GCF: S. Benedetto V.S. -Vaiano-PC80 lavori in GGA

1	Descrizione attività: Rinnovo TE e finiture di opere civili e adeguamento sicurezza in galleria
	Periodo di lavorazione: da fine settembre a dicembre
	Impegno di personale - UMLV2: 4/6 - UMIS2: 4/5 - UMTT2: 6/7
2	Interruzioni notturne: Interruzioni notturne dal lun/mar al ven/sab dal 28/09 al 14/12 con principale dalle 23,00 alle 4,00 e contemporanea 23,55 alle 03,45
3	Interruzioni puntuali Diurne: No
4	Interruzioni weekend/festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No



Handwritten signatures and initials in blue ink.

3 GCF-Sielte/Ellen: Pianoro-S.Benedetto V.S.-Lavorazioni TE + Sostituzione segnali di tratta tra le stazioni di Pianoro e Monzuno

1	Descrizione attività: Lavorazioni TE a Monzuno e Grizzana e Sostituzione dei segnali in galleria Monte Adone
	Periodo di lavorazione: da settembre a dicembre 2026
	Impegno di personale - UMIS: 3 - UMTT: 5 - UMLV: 0
2	Interruzioni notturne: Interruzioni notturne dal lun/mar al ven/sab dal 28/09 al 14/12/2026 con principale dalle 23,30 alle 03,45 e contemporanea 23,50 alle 03,45
3	Interruzioni puntuali Diurne: No
4	Interruzioni weekend/festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No

4 GCF-Sielte/Ellen: Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto + Sostituzione casse induttive in stazione di San Ruffillo

1	Descrizione attività: Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto varie tratte + Sostituzione casse induttive ambito stazione di San Ruffillo
	Periodo di lavorazione: dal 08 al 18 dicembre 2026 (Lavori TE) + da ottobre a dicembre (Lavori IS)
	Impegno di personale - UMIS: 3 - UMTT: 5
2	Interruzioni notturne: principale di 4 ore con contemporanea di 3 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: No
4	Interruzioni weekend/festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No



5 CLF: Sostituzione A/C dev 5 Monzuno, cuore dev. 3b Vernio, cuore dev. 2 S.Benedetto

1 **Descrizione attività:**
Sostituzione A/C dev 5 Monzuno, cuore dev. 3b Vernio, cuore dev. 2 S.Benedetto
Periodo di lavorazione:
Dal 2 al 15 Novembre
Impegno di personale
- U.M.S.: 3
- U.M.T.E.: 4
- U.M.I.V.: 5
2 **Interruzioni notturne:** in ombra a quelle della PC80 (attività 2 e 3 sopra)
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

6 Siete - Mermec: Attivazione PAIPL Casalecchio km 122+176 e Riola km 85+217

1 **Descrizione attività:**
Attivazione PAIPL Casalecchio km 122+176 e Riola km 85+217
Periodo di lavorazione:
Notti 6/7, 8/9, 13/14, 16/17, 20/21, 23/24, 27/28, 29/30 Ottobre, 10/11, 12/13, 16/17, 20/21 Novembre, 18/19 Dicembre 2026
Impegno di personale
- U.M.S.: 6
- U.M.T.E.:
- U.M.I.V.: 2
2 **Interruzioni notturne:** Casalecchio Gi.-Porretta dalle 23:40 alle 04:40
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

7 GCF: Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto

1 **Descrizione attività:**
Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto varie tratte
Periodo di lavorazione:
dal 17 al 19 dicembre 2026
Impegno di personale
- U.M.I.V.: 0
- U.M.S.: 0
- U.M.T.E.: 5
2 **Interruzioni notturne:** Casalecchio Gi.-Porretta dalle 23:40 alle 04:40
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** weekend SI/festivi NO
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

8 Siete - Mermec: Pistoia-Valdibiana - Attivazione PAIPL km 37+179

1 **Descrizione attività:**
Attivazione PAIPL km 37+179
Periodo di lavorazione:
dal 15 settembre al 22 ottobre 2026
Impegno di personale
- U.M.I.V.: 0
- U.M.S.: 4
- U.M.T.E.: 0
2 **Interruzioni notturne:** Porretta-Pistoia dalle ore 22,30 alle ore 5,00
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

9 CLF: Piazzale Arcoveggio - Rinnovo 5 deviatoi

- 1 **Descrizione attività:**
Rinnovo dev. SI 5.A/6B, 04/03B, 04B, 05B, Intersezione 1
Periodo di lavorazione:
12 ottobre al 04 novembre 2026
Impegno di personale
- UMLA: 4
- UMIS: 3
- UMTE: 3
- 2 **Interruzioni:** interruzione continuativa dei binari del piazzale
- 3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
- 4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
- 5 **Variazioni di Orario No standard:** No
- 6 **Variazioni di fascia:** necessità di incrementare il turno del mattino M 07:00-14:36 di TE1 rinunciando a prestazioni P o N
- 7 **Notti >8 h:** No
- 8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

10 CLF: Bologna Ravone - Rinnovo 9 deviatoi

- 1 **Descrizione attività:**
Rinnovo dev. 16, 19, 21, 39, 35, 20, 36, 15, 1, 28
Periodo di lavorazione:
dal 02 novembre al 05 dicembre 2026
Impegno di personale
- UMLA: 4
- UMIS: 3
- UMTE: 3
- 2 **Interruzioni notturne:** principale di 5,30 ore con contemporanea di 5,00 ore
- 3 **Interruzioni puntuali diurne:** p.m.
- 4 **Interruzioni weekend/festivi:** p.m.
- 5 **Variazioni di Orario No standard:** p.m.
- 6 **Variazioni di fascia:** Per poter gestire lavorazioni concomitanti (rifacimento marciapiedi) potrebbero essere necessari cambi turno da P a M
- 7 **Notti >8 h:** No
- 8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

**11 CLF: S.Viola - Rinnovo 3 deviatoi**

- 1 **Descrizione attività:**
Rinnovo dev. 260, 272 sul Pari PT e 273 sul Pari PC
Periodo di lavorazione:
dal 9 al 19 dicembre 2026
Impegno di personale
- UMLA: 4
- UMIS: 3
- UMTE: 3
- 2 **Interruzioni notturne di linea:** Bologna C.le-S.Viola della durata di 6 ore la principale con 5 ore di contemporanea
- 3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
- 4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
- 5 **Variazioni di Orario No standard:** No
- 6 **Variazioni di fascia:** No
- 7 **Notti >8 h:** No
- 8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

12 Baraldini: Bologna Ravone - Rifacimento marciapiedi

- 1 **Descrizione attività:**
Attività di rifacimento dei marciapiedi, ad uso delle attività manutentive delle Imprese Ferroviarie (Pillar 2)
Periodo di lavorazione:
dal 5 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027
Impegno di personale
- UMLA: 3
- UMIS: 0
- UMTE: 1
- 2 **Interruzioni:** interruzione continuativa dei binari del piazzale
- 3 **Interruzioni notturne:** No
- 4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
- 5 **Variazioni di Orario No standard:** No
- 6 **Variazioni di fascia:** Per poter gestire lavorazioni concomitanti (rifacimento marciapiedi) potrebbero essere necessari cambi turno da P a M per LA1
- 7 **Notti >8 h:** No
- 8 **Reperibilità max 10 giorni:** No



13 GCF: Rinnovo TE Bologna Fiere-S.Donato**1 Descrizione attività:**

Rinnovo TE

Periodo di lavorazione:

dal 23 novembre al 4 dicembre 2026, dal 11 gennaio al 22 aprile 2027

Impegno di personale

- UMLV: 0

- UMIS: 0

- UMTE: 5

2 Interruzioni diurne di linea: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30**3 Interruzioni notturne:** No**4 Interruzioni weekend/festivi:** No**5 Variazioni di Orario No standard:** No**6 Variazioni di fascia:** necessità di incrementare il turno del mattino M 07:00-14:36 di TE1 rinunciando a prestazioni P o N**7 Notti >8 h:** No**8 Reperibilità max 10 giorni:** No**14 GCF: Lavino-C.Franco Rinnovo TE binari Dispari+Pari****1 Descrizione attività:**

Attività di rinnovo TE scavi e getti

Periodo di lavorazione:

dal 4 ottobre al 18 dicembre 2026 - tale lavoro potrebbe essere differito

Impegno di personale

- UMTE: 6

2 Interruzioni notturne di linea: C.Franco Lavino pari e dispari con interruzione base dalle 00:30 alle 04:30 e contemporanea dalle 01:00 alle 04:30**3 Interruzioni puntuali Diurne:** No**4 Interruzioni weekend/festivi:** No**5 Variazioni di Orario No standard:** No**6 Variazioni di fascia:** No**7 Notti >8 h:** No**8 Reperibilità max 10 giorni:** No**15 GCF: Bologna C.le - Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto****1 Descrizione attività:**

Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto varie tratte

Periodo di lavorazione:

dal 11 al 14 dicembre 2026

Impegno di personale

- UMLV:

- UMIS:

- UMTE: 6

2 Interruzioni notturne: ambito Bologna C.le della durata di 4,30 ore**3 Interruzioni puntuali Diurne:** No**4 Interruzioni weekend/festivi:** NO**5 Variazioni di Orario No standard:** No**6 Variazioni di fascia:** No**7 Notti >8 h:** No**8 Reperibilità max 10 giorni:** No**16 GCF: BO-MI AV - Attività di sostituzione filo della Linea Di Contatto varie tratte****1 Descrizione attività:**

Attività di sostituzione filo della LDC varie tratte

Periodo di lavorazione:

dal 12 al 13 dicembre 2026

Impegno di personale

- UMTE: 5

2 Interruzioni notturne di linea: della durata di 6 ore**3 Interruzioni puntuali Diurne:** No**4 Interruzioni weekend/festivi:** No**5 Variazioni di Orario No standard:** No**6 Variazioni di fascia:** No**7 Notti >8 h:** No**8 Reperibilità max 10 giorni:** No

17 Baraldini: Consolidamento cavalcferrovia di via Matteotti km 96+728

1 **Descrizione attività:**
Consolidamento cavalcferrovia di via Matteotti km 96+728 - fase campata 4
Periodo di lavorazione:
dal 18 gennaio al 15 febbraio 2027
Impegno di personale
- UMLV: 4
- UMIS: 4
- UMTE: 4
2 **Interruzioni notturne:** ambito Bologna C.le della durata di 5 ore
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

18 Baraldini - CLF: Impermeabilizzazioni ponte via Massarenti km 3+342

1 **Descrizione attività:**
Impermeabilizzazioni ponte via Massarenti km 3+342
Periodo di lavorazione:
dal 16 al 23 gennaio 2027
Impegno di personale
- UMLV: 4
- UMIS: 3
- UMTE: 4
2 **Interruzioni:** WE del 16/17 gennaio + interruzioni notturne dal 18 al 22 gennaio della BO-RN di 5 ore
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** Weekend Si/ Festivi No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

19 CLF: Bologna C.le-B.S.Vitale Sostituzione rotaie binario pari dal km 1+200 al km 2+650

1 **Descrizione attività:**
Sostituzione rotaie binario pari dal km 1+200 al km 2+650
Periodo di lavorazione:
dal 11 al 22 gennaio 2027
Impegno di personale
- UMLV: 5
- UMIS: 3
- UMTE: 4
2 **Interruzioni:** interruzioni notturne dal 11 al 15 gennaio della BO-RN di 5 ore + WE del 16/17 gennaio + interruzioni notturne dal 18 al 22 gennaio della BO-RN di 5 ore
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** Weekend Si/ Festivi No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

20 GCF -Sielte: Bologna PCS-C.Franco Est posa nuova fibra

1 **Descrizione attività:**
Attività di posa di nuova fibra sui pali TE dal PCS lungo la linea BO-MI AV
Periodo di lavorazione:
dal 5 ottobre al 19 dicembre 2026
Impegno di personale
- UMLV: 4
2 **Interruzioni notturne di linea:** della durata di 6 ore
3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No
4 **Interruzioni weekend/festivi:** No
5 **Variazioni di Orario No standard:** No
6 **Variazioni di fascia:** No
7 **Notti >8 h:** No
8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

21 FEA S.r.l., Zini Elio S.r.l. e Ediltecnica S.r.l.: Bretella AV Venezia Attività di spinta monolite per realizzazione del nuovo canale di scarico delle acque meteoriche verso il fiume Reno, al km 2+256

1	Descrizione attività: Attività di spinta monolite per realizzazione del nuovo canale di scarico delle acque meteoriche verso il fiume Reno, al km 2+256
	Periodo di lavorazione: dal 31 agosto al 4 novembre 2026
	Impegno di personale - UMI.V: 4 - UMIS: 0 - UMTE: 4
2	Interruzioni notturne di linea: della durata di 6 ore
3	Interruzioni puntuali Diume: No
4	Interruzioni weekend / festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No

22 GCF: BO-FI AV Sostituzione di tutte le taglie della linea

1	Descrizione attività: Attività di sostituzione delle taglie della LDC
	Periodo di lavorazione: dal 5 ottobre al 23 dicembre 2026
	Impegno di personale - UMTE: 5
2	Interruzioni notturne di linea: B.Emilia-Fi Castello dalle 23:10 alle 05:50
3	Interruzioni puntuali Diume: No
4	Interruzioni weekend / festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No

23 Ceprini: BO-FI AV Impermeabilizzazioni di vari tratte delle gallerie Vaglia, Raticosa e Firenzuola

1	Descrizione attività: Attività di impermeabilizzazione di vari tratti delle gallerie
	Periodo di lavorazione: dal 14 settembre al 27 novembre 2026
	Impegno di personale - UMI.V: 4 - UMTE: 3
2	Interruzioni notturne di linea: B.Emilia-Fi Castello dalle 23:10 alle 05:50
3	Interruzioni puntuali Diume: No
4	Interruzioni weekend / festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No

24 CLF: Attività di livellamento sistematico sulla BO-FI AV e di 2° livello sulla BO-MI AV

1	Descrizione attività: Attività di livellamento sistematico e 2° livello
	Periodo di lavorazione: dal 3 novembre al 22 dicembre 2026
	Impegno di personale - UMI.V: 6 - UMIS: 4/6 - UMTE: 4
2	Interruzioni notturne di linea: della durata di 6 ore
3	Interruzioni puntuali Diume: No
4	Interruzioni weekend / festivi: No
5	Variazioni di Orario No standard: No
6	Variazioni di fascia: No
7	Notti >8 h: No
8	Reperibilità max 10 giorni: No

25 CLF: PM Reno-PM Anzola - Molatura delle rotaie

1 **Descrizione attività:**
Molatura binari Pari+Disp dal km 11+00 al km 21+000
Periodo di lavorazione:
dal 11 al 18 gennaio 2027
Impegno di personale
- UMI.V: 2
- UMIS: 0
- UMTE: 0

2 **Interruzioni notturne di linea:** della durata di 6 ore

3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No

4 **Interruzioni weekend/festivi:** No

5 **Variazioni di Orario No standard:** No

6 **Variazioni di fascia:** No

7 **Notti >8 h:** No

8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

26 CLF: Bologna C.le AV-B.Emilia - Sostituzione rotaie binario Pari+Disp dal POC Savena al km 91+200

1 **Descrizione attività:**
Sostituzione rotaie binario Pari+Disp dal POC Savena al km 91+200
Periodo di lavorazione:
dal 11 gennaio al 19 febbraio 2027
Impegno di personale
- UMI.V: 6
- UMIS: 4/6
- UMTE: 4

2 **Interruzioni notturne di linea:** della durata di 6 ore

3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No

4 **Interruzioni weekend/festivi:** No

5 **Variazioni di Orario No standard:** No

6 **Variazioni di fascia:** No

7 **Notti >8 h:** No

8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

27 CLF: Grizzana-Monzuno-Impermeabilizzazione ponte km 65+923

1 **Descrizione attività:**
Impermeabilizzazione ponte km 65+923
Periodo di lavorazione:
da febbraio 2027 a Marzo 2027
Impegno di personale
- UMI.V2: 6/8
- UMIS2: 6/8
- UMTE2: 6/7

2 **Interruzioni notturne:** No

3 **Interruzioni puntuali Diurne:** No

4 **Interruzioni weekend/festivi:** SI 20/21 feb, 27/28 feb, 06/07 mar, 20/21 mar dalle ore 9,30 del sabato alle 16,30 della domenica

5 **Variazioni di Orario No standard:** No

6 **Variazioni di fascia:** possibile sussidio da UM limitrofe

7 **Notti >8 h:** No

8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

28 CLF: S.Ruffillo-Rinnovo a campate del 1° Binario

1 **Descrizione attività:**
Rinnovo a campate del 1° Binario di S.Ruffillo
Periodo di lavorazione:
da 22 febbraio al 19 Marzo 2027
Impegno di personale
- UMI.V2: 4
- UMIS2: 3
- UMTE2: 4

2 **Interruzioni notturne:** del Binario Pari della durata di 5 ore tratta Pianoro-B.Crociati dal 22 febbraio al 19 marzo

3 **Interruzioni continuativa:** del 1 binario di S.Ruffillo dal 22 febbraio al 19 marzo 2027

4 **Interruzioni weekend/festivi:** No

5 **Variazioni di Orario No standard:** No

6 **Variazioni di fascia:**

7 **Notti >8 h:** No

8 **Reperibilità max 10 giorni:** No

PdA MAI
novembre-dicembre 2026 e gennaio-febbraio 2027

ottobre 2026



DOIT Bologna – MAI

INTRODUZIONE

Seguendo le Linee Guida per la pianificazione delle risorse finalizzate al processo della manutenzione la Direzione Operativa Infrastrutture di Bologna persegue gli obiettivi:

- ☐ massima sicurezza e affidabilità della circolazione su tutte le tipologie di linea;
- ☐ saturazione orari di lavoro con attività strategiche (*obblighi di legge, manutenzione ciclica prioritaria e non, piano stagionale, manutenzione da analisi di diagnostica fissa e mobile e da analisi delle anomalie, investimenti e potenziamenti*);
- ☐ massimizzare l'utilizzo dei mezzi di lavoro;
- ☐ efficientare e razionalizzare la gestione del pronto intervento;
- ☐ ottimizzare e potenziare le internalizzazioni con particolare attenzione alle tecnologie;
- ☐ ottimizzare la gestione dei materiali;
- ☐ garantire gli impegni verso le altre società del Gruppo.

DOIT Bologna – MAI

Tipologie di manutenzione

ORDINARIA

- Mantenere integrità originaria del bene
- Mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni
- Contenere il normale degrado d'uso
- Garantire la vita utile del bene
- Far fronte ad eventi accidentali

STRAORDINARIA

- Incrementare il livello di sicurezza
- Incrementare il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela
- Elevare l'affidabilità ed efficienza delle infrastrutture ferroviarie
- Elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture ferroviarie
- Uniformare gli standard prestazionali degli attuali impianti

ECCEZIONALE

- Ripristinare l'efficienza dei beni a seguito calamità naturali, furti, atti vandalici, ect...

DOIT Bologna – MAI

Manutenzione Ordinaria

ORDINARIA

- Mantenere integrità originaria del bene
- Mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni
- Contenere il normale degrado d'uso
- Garantire la vita utile del bene
- Far fronte ad eventi accidentali

MANUTENZIONE CICLICA DELL'INFRASTRUTTURA

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA

VERIFICHE DI LEGGE

MANUTENZIONE CORRETTIVA

VERIFICHE PERIODICHE

STRAORDINARIA

- Incrementare il livello di sicurezza
- Incrementare il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela
- Elevare l'affidabilità ed efficienza delle infrastrutture ferroviarie
- Elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture ferroviarie
- Uniformare gli standard prestazionali degli attuali impianti


MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERA DI DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA

MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI / TECNOLOGICI

ADEGUAMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

ACQUISTI A RIMPIAZZO


AUMENTO PRODUTTIVITA'

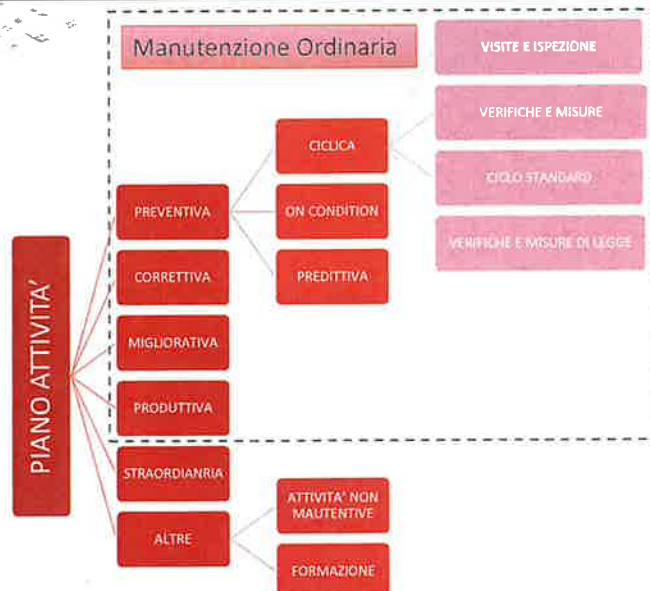

DOIT Bologna – MAI

Piano di Attività DOIT: anno 2026


ANNO 2026									
Ore Capacità CdL	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Correttiva	Preventiva Ciclica	On-Condition	Altre Attività	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internalizzata	Manutenzione Straordinaria	
303.851	8.543	76.279	70.483	3.334	35.523	19.162	75.830	14.925	303.919
n° Notti	81	1.309	2.357	58	119	8	2.841	372	7.145

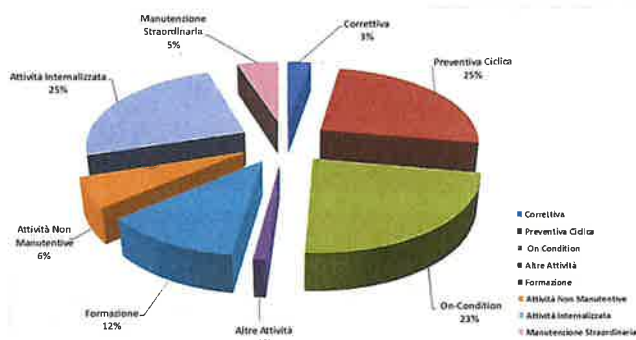

DOIT Bologna – MAI

Piano di Attività DOIT: NOV-DIC 2026

nov-dic 2026									
Ore Capacità CdL	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Correttiva	Preventiva Ciclica	On-Condition	Altre Attività	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internalizzata	Manutenzione Straordinaria	
50.115	1.631	7.823	12.120	271	3.531	3.129	12.993	8.619	50.115
n° Notti	14	200	393	6	10	0	474	65	1.161

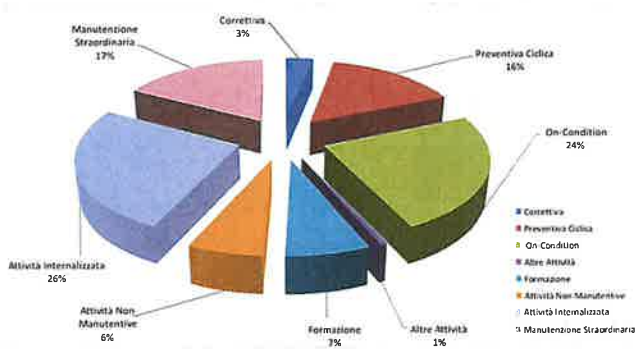

DOIT Bologna – MAI- DIA

Piano di Attività DOIT: NOV-DIC 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notte	nov	dic	
Correttiva	100	Attività svolta per la manutenzione di guasti	-	-	-	-	
Ciclica	211	Visite di sorveglianza e visite Attre Visite: ispezioni, verifiche e misure di tipo ciclico previste da regolamenti FS Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS	214	31	154	60	
	212	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS	-	-	-	-	
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive eseguite a seguito di visite, misure, segnalazioni pervenute da sistemi di monitoraggio diagnostico (testure TALETE, ALCEMED, o PVI, MAIA) e fenomeni avaria che non hanno causato guasti	457	43	230	177	
Obbl. di Legge	240	Attività impiantistiche di verifica e misure imposte da leggi dello Stato	-	-	-	-	
Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto	-	-	-	-	
Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in conto M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-	
Formazione	500	Attività di formazione	300	2	150	150	
Attività non man.	600	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività manutent.	235	-	120	115	
Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi (o in conto terzi) Varie	-	-	-	-	
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'urgenza (rischi di ordine interno Roma)	-	-	-	-	
Diag. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (testure TALETE, ARCHIMEDE, ALDEBANAN, ...)	465	-	265	200	
Lavori internalizzati di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	NTW	Lavori internalizzati relativi ad Armeamento, Tecnologie, Invelemento binari e deviatori, cambio filo linea di contatto, riciclaggio e apparecchiature	1.035	52	535	500	
		Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	2.433	46	1.116	1.317	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
TOT NTW			3.468	-	1.651	1.817	
Totale ore Fabbisogno			6.140	173	2.670	2.670	
Totale ore Capacità (2)			6.140	-	2.670	2.670	

DOIT Bologna – MAI- CMA

Piano di Attività DOIT: NOV-DIC 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notti	nov	dic
Correttiva	100	Attività svolta per la riparazione dei guasti	403	2	245	156
Ciclica	211	Visite di sorveglianza e visite Attre Visite: ispezioni, verifiche e misure di tipo ciclico previste da regolamenti FS Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS	400	11	200	200
	212	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS				
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive eseguite a seguito di visite, misure, segnalazioni pervenute da sistemi di diagnostica diagnostiche (testure TALETE, ARCHIMEDE o PVI, MAIA) e fenomeni avaria che non hanno causato guasti	5.854	230	2.679	2.905
Obbl. di Legge	240	Attività manutentive di verifica e misure imposte da leggi dello Stato	32	-	8	24
Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto				
Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in conto M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti				
Formazione	500	Attività di formazione	856	2	443	413
Attività non man.	600	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività manutent.	820	-	410	410
Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi (o in conto terzi) Varie	-	-	-	-
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'urgenza (rischi di ordine interno Roma)	-	-	-	-
Diag. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (testure TALETE, ARCHIMEDE, ALDEBANAN, ...)	-	-	-	-
Lavori internalizzati di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	NTW	Lavori internalizzati relativi ad Armeamento, Tecnologie, Invelemento binari e deviatori, cambio filo linea di contatto, riciclaggio e apparecchiature	5.600	233	2.600	2.600
		Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	160	-	80	80
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
TOT NTW			5.760	-	2.680	2.680
Totale ore Fabbisogno			14.136	478	7.068	7.068
Totale ore Capacità (2)			14.136	-	7.068	7.068

DOIT Bologna – MAI- IG

Piano di Attività DOIT: NOV-DIC 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notte	nov	dic	
Correttiva	100	Attività svolte per la riparazione dei guasti	147	2	60	85	
Ciclica	211	Visite di ispezione e manutenzione preventive a mezzo di tipo ciclico previsto da regolamento FS	125	31	75	50	
	212	Attività di manutenzione di tipo ciclico previsto da regolamento FS	457	58	304	153	
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive eseguite a seguito di visite mirate, segnalazioni pervenute da sistemi di rivelazione diagnostica (velture TALETE, ARCHIMEDE, P.V.V. MAIA) e fenomeni anomali che non hanno causato guasti	50	46	25	25	
Obbl. di Legge	240	Attività manutentive di verifica e misura imposta da leggi dello Stato	42	5	34	3	
Migliorativa	300	Attività di miglioramenti e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'infrastruttura	-	-	-	-	
Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in conto M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-	
Formazione	500	Attività di formazione	725	2	442	283	
Attività non man	600	Attività che non hanno aderenza con una specifica attività manutentiva	400	-	200	200	
Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi o in conto terzi	-	-	-	-	
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'emergenza (fuori da ordine interno Roma)	-	-	-	-	
Diag. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (velture TALETE, ARCHIMEDE, ALDEBARAN, ...)	-	-	-	-	
Lavori internalizzati di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	NTW	Lavori internalizzati relativi ad Ammodernamento, Tecnologie, livellamento binari e deviazioni, cambio filo linea di contatto, ricambioamento apparecchiature	906	62	456	450	
		Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	2.031	-	846	1.185	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
TOT NTW			2.937	-	1.302	1.635	
Totale ore Fabbisogno			4.883	205	2.442	2.442	
Totale ore Capacità (2)			4.883	-	2.442	2.442	



Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

DOIT Bologna – MAI- TLC

Piano di Attività DOIT: NOV-DIC 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notte	nov	dic	
Correttiva	100	Attività svolte per la riparazione dei guasti	495	4	267	233	
Ciclica	211	Visite di ispezione e manutenzione preventive a mezzo di tipo ciclico previsto da regolamento FS	1.627	33	1.184	263	
	212	Attività di manutenzione di tipo ciclico previsto da regolamento FS	523	4	282	135	
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive eseguite a seguito di visite mirate, segnalazioni pervenute da sistemi di rivelazione diagnostica (velture TALETE, ARCHIMEDE, P.V.V. MAIA) e fenomeni anomali che non hanno causato guasti	2.051	45	1.480	1.531	
Obbl. di Legge	240	Attività manutentive di verifica e misura imposte dal legge dello Stato	19	-	8	12	
Migliorativa	300	Attività di miglioramenti e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'infrastruttura	45	0	38	8	
Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in conto M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	25	-	30	5	
Formazione	500	Attività di formazione	1.106	2	281	745	
Attività non man	600	Attività che non hanno aderenza con una specifica attività manutentiva	572	-	286	286	
Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi o in conto terzi	-	-	-	-	
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'emergenza (fuori da ordine interno Roma)	-	-	-	-	
Diag. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (velture TALETE, ARCHIMEDE, ALDEBARAN, ...)	-	-	-	-	
Lavori internalizzati di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	NTW	Lavori internalizzati relativi ad Ammodernamento, Tecnologie, livellamento binari e deviazioni, cambio filo linea di contatto, ricambioamento apparecchiature	3.463	26	1.666	1.800	
		Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	1.523	10	255	1.268	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
TOT NTW			4.986	-	1.921	3.065	
Totale ore Fabbisogno			12.593	119	6.297	6.297	
Totale ore Capacità (2)			12.593	-	6.297	6.297	



DOIT Bologna – MAI- SSE


Piano di Attività DOIT: NOV-DIC 2026

TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./ Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2026	notte	nov	dic
Correttiva	100	Attività svolte per le operazioni da guasto	585	6	365	220
Ciclica	211	Verifica di livello a livello Altre verifiche, operazioni, controllo e misure di tipo ciclico previste da regolamento PB	1.033	40	663	970
	212	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamento PB	2.391	6	1.468	923
On Condition	221-222 231-232	Attività manutentive a regime, a regime di ciclo, misure, regolazioni, assistenza da uomini di manutenzione (preghiamo di vedere TALETE e ARCHIMIDE) PV, MAIA e Personale addetti, che non hanno le stesse quote	2.756	25	1.509	1.249
Obbl di Legge	240	Attività manutentive di verifica e misure imposte da leggi dello Stato	159	-	75	84
Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'efficienza dell'impianto	200	-	70	130
Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in corso M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-
Formazione	500	Attività di formazione	544	3	342	200
Attività non man	600	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività manutentiva	636	-	340	296
Conti Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi e/o in conto terzi Varie	-	-	-	-
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'emergenza (fuori da orario normale)	-	-	-	-
Diag. Nazionale	900	Attività legate alle diagnosi nazionali (vedere TALETE, ARCHIMIDE, ALDOBRANDI, ...)	-	-	-	-
Lavori internalizzati di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	NTW	Lavori internalizzati relativi ad Assistenza, Tecnologia, Sviluppo, Innovazione e ricerca, cambio della linea di condotta, riassetto organizzativo	1.985	51	960	1.001
		Lavori MSA e scorte altri lavori di utilità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	2.472	10	867	1.605
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
TOT NTW			4.457	-	1.847	2.610
Totale ore Fabbisogno			13.364	187	6.682	6.682
Totale ore Capacità (Z)			13.364	-	6.682	6.682

DOIT Bologna – MAI- SSE

Piano di Attività DOIT: GEN – FEB 2027

gennaio - febbraio ANNO 2027									
Ore Capacità Cef	MANUTENZIONE ORDINARIA				ALTRE ATTIVITA'		ATTIVITA' A PROGETTO		TOTALE FABBISOGNO
	Correttiva	Preventiva Ciclica	On-Condition	Altre Attività	Formazione	Attività Non Manutentive	Attività Internalizzata	Manutenzione Straordinaria	
50.115	1.469	15.979	12.807	1.553	6.510	9.200	7.495	2.304	50.115
n. Nomi	14	210	399	10	13	5	474	16	1138

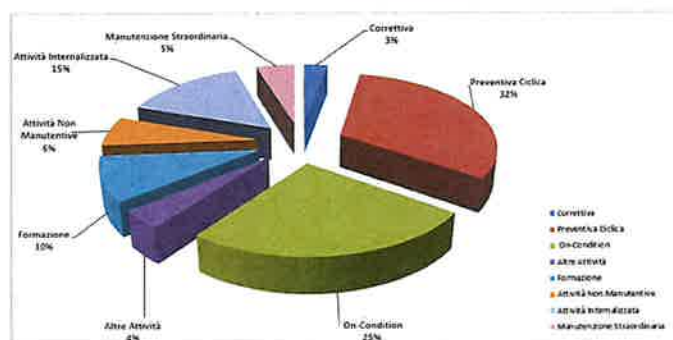

DOIT Bologna – MAI- DIA

Piano di Attività DOIT: GENNAIO - FEBBRAIO 2027

TIPOLOGIA ATTIVITA'	D.d.L./Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2027	note	ore OPA - OPA - OPA	gen	feb
MAI (vedi E-Mercy)	Correttiva	Attività svolta per la riparazione dei guasti	4				4
	Visite	Visite di località e tratta					
	Chiusa	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS	2.736	31		1.102	1.634
		Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS					
	Da Condizione	Attività di manutenzione eseguite a seguito di visita, misure, segnalazioni pervenute da sistemi di rilevazione diagnostiche (vedere TALETE o ARCHEME o PV7, MAIA) e fenomeni esterni che non hanno causato guasti	780	43		614	167
	Obl. di Legge	Attività di manutenzione di servizio e misure imposte da leggi dello Stato					
	Migliorativa	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto					
Pens. Vento	Att. Produzione	Attività impiantistiche in corso M.O. finalizzate a piccoli interventi e sostituzioni degli impianti					
	Formazione	Attività di formazione	373	2		175	198
	Attività non pian.	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività pianificata	311			182	129
	Costo Teor.	Attività svolte per dare assistenza a terzi ed in nome terzi					
	Interv. Urgenza	Attività legate ad interventi d'emergenza (finanziati da ordine interno Roma)					
Diag. Nazionale		Attività legate alla diagnostica nazionale (vedere TALETE, ARCHEME, ALDEBAN)	222			136	86
		Lavori intermodali relativi ad Armamento, Tecnologie, livellamento binari e deviatori, cambio filo linea di contatto, riassetto apparecchiature	578	52		226	352
Lavori intermodali di competenza -- Lavori MSA e scorte altri lavori di unità -- Altri Lavori in MS -- Servizio Tecnico e altre MGO		Lavori MSA e scorte altri lavori di unità -- Altri Lavori in MS -- Servizio Tecnico e altre MGO	136			136	
TOTALE			714			362	352
Totale ore Fabbisogno			5.140	127		2.570	2.570
Totale ore Capacità (2)			5.140			2.570	2.570
Differenza			0				0
Sussidio in uscita							
Sussidio in entrata							
Totale Ore Straordinario							

DOIT Bologna – MAI - CMA

Piano di Attività DOIT: GENNAIO - FEBBRAIO 2027

TIPOLOGIA ATTIVITA'	D.d.L./Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2027	note	ore OPA - OPA - OPA	gen	feb
Correttiva	99	Attività svolta per la riparazione dei guasti	144	2		147	296
		Visite di località e tratta					
	77	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS	8	11			
Chiusa	201	Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS					
		Attività di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti FS					
Da Condizione	225-232 - 238	Attività di manutenzione eseguite a seguito di visita, misure, segnalazioni pervenute da sistemi di rilevazione diagnostiche (vedere TALETE o ARCHEME o PV7, MAIA) e fenomeni esterni che non hanno causato guasti	6.060	230		3.240	2.790
Obl. di Legge	240	Attività di manutenzione di servizio e misure imposte da leggi dello Stato					
Migliorativa	308	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto		4			
Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in corso M.O. finalizzate a piccoli interventi e sostituzioni degli impianti					
Formazione	500	Attività di formazione	1.481	2		589	902
Attività non pian.	600	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività pianificata	883			499	384
Costo Teor.	700-720-720-820	Attività svolte per dare assistenza a terzi ed in nome terzi	140			140	
Interv. Urgenza	800	Attività legate ad interventi d'emergenza (finanziati da ordine interno Roma)					
Diag. Nazionale	800	Attività legate alla diagnostica nazionale (vedere TALETE, ARCHEME, ALDEBAN)					
Lavori intermodali di competenza -- Lavori MSA e scorte altri lavori di unità -- Altri Lavori in MS -- Servizio Tecnico e altre MGO		Lavori intermodali relativi ad Armamento, Tecnologie, livellamento binari e deviatori, cambio filo linea di contatto, riassetto apparecchiature	3.987	230		1.956	2.031
		Lavori MSA e scorte altri lavori di unità -- Altri Lavori in MS -- Servizio Tecnico e altre MGO	1.000			300	700
TOTALE			4.967			2.256	2.711
Totale ore Fabbisogno			14.125	482		7.668	7.068
Totale ore Capacità (2)			14.125			7.668	7.068
Differenza			0				0
Sussidio in uscita							
Sussidio in entrata							
Totale Ore Straordinario							

DOIT Bologna – MAI - IG

Piano di Attività DOIT: GENNAIO - FEBBRAIO 2027

						ANNO 2027		
TIPOLOGIA ATTIVITA'	O.d.L./Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	ore pianificate 2027	notte	Costo DPR - Oss. Altri	gen	feb	
M.O. (Inf. E. Mezzi)	Correttiva	100	Attività svolta per la riparazione dei guasti	93	2	-	28	58
	Ciclica	211	Visite di località e tratta Altre Visite, sopralluoghi, verifiche e misure di tipo ordinario previste da regolamenti FS Attività di manutenzione di tipo ordinario previste da regolamenti FS	487	31	-	239	247
		212	Attività di manutenzione di tipo ordinario previste da regolamenti FS	2.244	59	-	1.123	1.120
	On Condition	221-222 224-232	Attività di manutenzione eseguite a seguito di visita, misura, segnalazioni provenienti da sistemi di rivelazione di guasti (TAVOLETTE, ALCEMEDE, ALDEBARAN) e fenomeni	37	45	-	14	23
	Obbl. di Legge	240	Attività manutenzione di verifica e misure imposte da leggi dello Stato	432	8	-	250	167
	Migliorativa	300	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto	-	-	-	-	-
	Att. Produzione	400	Attività impiantistiche in corso M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-	-
Prest. Varie	Formazione	500	Attività di formazione	818	2	-	411	407
	Attività non strutt.	600	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività strutturale	531	-	-	298	233
	Conto Terzi	700-720-730-M20	Attività svolte per dare assistenza a terzi e/o in conto terzi	-	-	-	-	-
	Interv. Urgenza	900	Attività legate ad interventi d'emergenza (fuoco da ordine interno Roma)	-	-	-	-	-
Diagn. Nazionale	900	Attività legate alla diagnostica nazionale (TAVOLETTE, ALCEMEDE, ALDEBARAN, ...)	-	-	-	-	-	
	Lavori intercalari di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di unità - Altri Lavori in MSA - Sostituzione binari e altre MSA	NTV	Lavori intercalari relativi ad Alimentazione, Tecnologia, Sostituzione binari e deviatori, cambio filo linea di contatto, Lavori MSA e scorte altri lavori di unità - Altri lavori in MSA - Sostituzione binari e altre MSA	152	82	-	70	82
Interventi a Progetto	NTV	TOT NTV	152	82	-	70	82	
		Totale ore Fabbisogno	4.883	209	-	2.441	2.442	
		Totale ore Capacità (2)	4.883	-	-	2.442	2.442	
		Differenza	0	-	-	0	0	
		Sussidio in uscita	-	-	-	-	-	
		Sussidio in entrata	-	-	-	-	-	
Totale Ore Straordinario			-	-	-	-	-	



Handwritten signatures and initials in blue ink, likely representing the approval of the plan.

DOIT Bologna – MAI - TLC

Piano di Attività DOIT: GENNAIO - FEBBRAIO 2027

tipologia ATTIVITA'	O.d.L./Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTI	pianificate 2027	notte	UP-10 - Oss. - Altri	gen	fe
M.O. (Inf. E. Mezzi)	Correttiva	Attività svolta per la riparazione dei guasti	522	4	-	285	237
	Ciclica	Visite di località e tratta Altre Visite, sopralluoghi, verifiche e misure di tipo ordinario previste da regolamenti FS	2.000	13	-	859	1.141
		Attività di manutenzione di tipo ordinario previste da regolamenti FS	1.160	4	-	618	342
	On Condition	Attività di manutenzione eseguite a seguito di visita, misura, segnalazioni provenienti da sistemi di rivelazione di guasti (TAVOLETTE, ALCEMEDE, ALDEBARAN) e fenomeni	3.279	45	-	1.882	1.847
	Obbl. di Legge	Attività manutenzione di verifica e misure imposte da leggi dello Stato	20	-	-	20	-
	Migliorativa	Attività di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto	1.949	5	-	759	1.190
	Att. Produzione	Attività impiantistiche in corso M.O. finalizzate a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	4	-	-	4	-
Prest. Varie	Formazione	Attività di formazione	1.272	5	-	638	415
	Attività non strutt.	Attività che non hanno attinenza con una specifica attività strutturale	577	-	-	303	274
	Conto Terzi	Attività svolte per dare assistenza a terzi e/o in conto terzi	4	1	-	-	4
	Interv. Urgenza	Attività legate ad interventi d'emergenza (fuoco da ordine interno Roma)	-	-	-	-	-
	Diagn. Nazionale	Attività legate alla diagnostica nazionale (retture TAVOLETTE, ALCEMEDE, ALDEBARAN...)	-	-	-	-	-
Interventi a Progetto	Lavori intercalari di competenza - Lavori MSA e scorte altri lavori di unità - Altri lavori in MSA - Sostituzione binari e altre MSA	Lavori intercalari relativi ad Alimentazione, Tecnologia, Sostituzione binari e deviatori, cambio filo linea di contatto, rilasciamento apparecchiature	1.174	36	-	506	574
		Lavori MSA e scorte altri lavori di unità - Altri lavori in MSA - Sostituzione binari e altre MSA	534	10	-	230	304
	TOT NTV		1.808	46	-	736	878
	Totale ore Fabbisogno		12.593	123	-	6.297	6.296
	Totale ore Capacità (2)		12.593	-	-	6.297	6.297
	Differenza		0	-	-	0	0
	Sussidio in uscita		-	-	-	-	-
	Sussidio in entrata		-	-	-	-	-
Totale Ore Straordinario		-	-	-	-	-	



Piano di Attività DOIT GENNAIO - FEBBRAIO 2027

IMPUGNATA ATTIVITA'	O.d.L./Intervento	DE SCRIZIONE INTERVENTI	pianificate 2027	noti	OPPR - Oliv. Attiv.	Gen	Feb
M.O. (Infr. e Mezzi)	Correttiva	100	Attrezz. di controllo per la riparazione dei guasti	316	0	150	166
	Ciclica	211	Visiva di controllo a tutto Attrezz. Visiva, superabiti, controllo e misure di tipo statico pericoloso da regolamenti F.I.	1.380	55	1.630	1.739
		212	Attrezz. di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti F.I.	3.117	8	1.877	1.660
	On Condition	221-222 213-232	Attrezz. di manutenzione di tipo ciclico previste da regolamenti F.I.	2.627	29	1.299	1.328
	Codici di Legge	240	Attrezz. di manutenzione di controllo e misure imposte da leggi dello Stato	387	-	218	168
	Migliorativa	300	Attrezz. di piccoli interventi e modifiche che hanno lo scopo di accorciare i tempi di lavoro dell'impiegato	-	-	-	-
Prest. Velle	Att. Produzione	400	Attrezz. impiantabili in loco M.O. finalizzati a piccoli miglioramenti e potenziamenti degli impianti	-	-	-	-
	Formazione	900	Attrezz. di formazione	977	2	283	204
	Attività non cont.	600	Attrezz. che non hanno attinenza con una specifica attività esecutiva	398	-	142	233
	Conto Terzi	700 720-730 M20	Attrezz. studiati per dare assistenza a terzi che in conto terzi Velle	-	-	-	-
	Interv. Urgenza	800	Attrezz. legate ad interventi d'emergenza (guasti da ondata termica fluviale)	293	-	-	28
	Diagn. Rifornimento	900	Attrezz. legate alla diagnostica nazionale (testare TALETE, ANDRONE, ALBERARANI...)	-	-	-	-
Interventi a Propaganda	Lavori intermodali di complezione - Lavori MSA e eccezioni altri lavori di unità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	MTV	Lavori intermodali relativi ad Armatore, Tecnologie, Sviluppamento linee e deviazioni, cambio illo linea di condotta, declassamento apparecchiature. Lavori MSA e eccezioni altri lavori di unità - Altri Lavori in MS - Scenario Tecnico e altre MSO	1.624 614	31 7	832 934	772
			TOT MTV	2.238		1.465	772
			Totale ore Fabbisogno	13.364	197	6.882	6.882
			Totale ore Capacità (7)	13.364		6.882	6.882
			Differenza	0		0	0
			Sussidio in uscita				
			Sussidio in entrata				
			Totale Ore Straordinarie				



Grazie

PdA UTEM
Novembre 2026-Febbraio 2027

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

n°	Località/Traffico	Descrizione attività	Linea	Appaltatore
1	Parmia - C.Giulio	Rinnovo/riparazione binario Pan e Dispan	Bologna-Piacenza	CLF
2	Stazione di Reggio Emilia	Rinnovo deviatore	Bologna-Piacenza	CLF
3	Stazione di Rubiera	Rinnovo deviatore	Bologna-Piacenza	CLF
4	Stazione di Modena	Rinnovo deviatore	Bologna-Piacenza	CLF
5	Rubiera-Mazzoglia	Rinnovo travata metallica	Bologna-Piacenza	CLF
6	Stazione di Parma	Installazione barriere Antirumore	Bologna-Piacenza	MBCS/ESLING
7	Fidenza - Fidenza Ovest	Eliminazione PL privato	Bologna-Piacenza	BARALDINI/STING
8	Fidenza - Reggio Emilia	Rinnovo binario a campate/Rinnovo TLE Sudo Parma/Sottopassaggio Comune di Reggio Emilia	Bologna-Piacenza	CLF/GCF
9	Stazione Fidenza	Demolizione binari 1° e 2° Sudo/Rinnovo deviatore 14A/Rinnovo binario 1° Est	Bologna-Piacenza	CLF
10	Linea AV/MC	Molatura Rotore	Bologna-Milano AV	SAJCEP
11	Linea AV/MC	Scarico Pietrisco e Livellamento	Bologna-Milano AV	CLF
12	Linea AV/MC	Sostituzione spezzoni Rotore	Bologna-Milano AV	CLF
13	PG Piacenza - Fidenza Ovest	Scarico Rotore	Bologna-Milano AV	CLF
14	Stazione Suzzara	Rinnovo binario a campate	Modena-Suzzara	CLF
15	Linea AV/MC	Cambio Pilo	Bologna-Milano AV	GRUP
16	Linea AV/MC	Rivisione TLE	Bologna-Milano AV	GCF
17	Bologna-Piacenza	Installamento h55 e lavori pensiline	Rubiera	Expem/Doc Stazcom
18	Bologna-Piacenza e C.M.A.V. Reggio Emilia	MSA armamento	Bologna-Piacenza	CLF

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

1	Bologna-Piacenza: Rinnovo/risanamento binario Pari e Dispari
1	Descrizione attività: Rinnovo/risanamento dei binari Pari/Dispari con sostituzione totale di traverse, rotaie, massicciata nella tratta Parma - C.Guelfo
2	Periodo di lavorazione: Ottobre - Dicembre 2026 e Gennaio 2027
3	Impegno di personale: - U.M.A.1: 6/8 - U.M.S.1: 4/6 - U.M.T.E.2: 6/7
4	Interruzioni notturne: Parma - C.Guelfo dal L/M al V/S dal 05 ottobre al 18 dicembre dalle 00 alle 05:00 - poi dal 14 gennaio al 31 gennaio 2027 notti G/V, V/S, S/D, D/L
5	Interruzioni puntuali Diurne: No
6	Interruzioni weekend/festive: No
7	Variazioni di Orario No standard: No
8	Variazioni di fascia: No
9	Notti >8 h: No
10	Reperibilità max 10 giorni: No

2	Bologna-Piacenza: Rinnovo deviatò Reggini Emilia
1	Descrizione attività: Rinnovo deviatò binari di corsa Pari/Dispari nella stazione di Reggio Emilia
2	Periodo di lavorazione: Ottobre - Novembre 2026
3	Impegno di personale: - U.M.A.2: 4/5 - U.M.S.2: 3/4 - U.M.T.E.2: 2/3
4	Interruzioni notturne: Interruzioni notturne Sfilino-Reggio e Reggio-Rubiera dal L/M al V/S dal 05/10 al 20/21 novembre dalle 00:00 alle 5:00
5	Interruzioni puntuali Diurne: No
6	Interruzioni weekend/festive: No
7	Variazioni di Orario No standard: No
8	Variazioni di fascia: No
9	Notti >8 h: No
10	Reperibilità max 10 giorni: No



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

3	Bologna-Piacenza: Rubiera - Rinnovo deviatò 5A
1	Descrizione attività: Rinnovo deviatò 5A ambito Stazione di Rubiera
2	Periodo di lavorazione: 1 - 6 Dicembre 2026
3	Impegno di personale: - U.M.A.2: 4/5 - U.M.S.2: 3/4 - U.M.T.E.2: 3/4
4	Interruzioni notturne: Interruzioni notturne Rubiera-Mezzigha dal L/M al V/S dal 30/11 al 06/12 dalle 00:00 alle 5:00
5	Interruzioni puntuali Diurne: No
6	Interruzioni weekend/festive: No
7	Variazioni di Orario No standard: No
8	Variazioni di fascia: No
9	Notti >8 h: No
10	Reperibilità max 10 giorni: No

4	Bologna-Piacenza: Modena - Rinnovo deviatò 135
1	Descrizione attività: Rinnovo deviatò 135 ambito Stazione di Modena
2	Periodo di lavorazione: 9 - 11 Dicembre 2026
3	Impegno di personale: - U.M.A.2: 4/5 - U.M.S.2: 3/4 - U.M.T.E.2: 3/4
4	Interruzioni notturne: Interruzioni notturne scalo Modena dal M/M al V/S dal 9/12 al 12/12 dalle 00:00 alle 5:00
5	Interruzioni puntuali Diurne: No
6	Interruzioni weekend/festive: No
7	Variazioni di Orario No standard: No
8	Variazioni di fascia: No
9	Notti >8 h: No
10	Reperibilità max 10 giorni: No



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

5 Bologna-Piacenza: Rinnovo travata metallica

- 1 Descrizione attività:
Sostituzione traverse e rotaie travata metallica fiume Secchia Pavi/Dispari
- Periodo di lavorazione:
02/27 novembre 2026
- Impegno di personale:
- CMIS: 2
- CMIT: 4
- CMIA: 3
- 2 Interruzioni notturne: Rubei (g) - Marzaglia (e) dal L/M al V/S dalle 00:00 alle 05:00
- 3 Interruzioni puntuali Diurne: No
- 4 Interruzioni weekend/festivi: No
- 5 Variazioni di Orario No standard: No
- 6 Variazioni di fascia: No
- 7 Notte >8 h: No
- 8 Repetibilità max 10 giorni: No

6 Bologna-Piacenza: Installazione barriere Antirumore

- 1 Descrizione attività:
Installazione barriere antirumore lato binario Dispari ambito stazione di Parma
- Periodo di lavorazione:
02 novembre - 11 novembre 2026, gennaio e febbraio 2027
- Impegno di personale:
- CMIT: 2
- 2 Interruzioni notturne: Interruzioni Parma (a) - Reggio Emilia (e) notti L/M, M/M, M/G (dal 02 novembre al 11 novembre) e interruzione notturne dal 14 gennaio al 31 gennaio notti G/V, V/S, S/D, D/L
- 3 Interruzioni puntuali Diurne: No
- 4 Interruzioni weekend/festivi: No
- 5 Variazioni di Orario No standard: No
- 6 Variazioni di fascia: No
- 7 Notte >8 h: No
- 8 Repetibilità max 10 giorni: No



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

7 Bologna-Piacenza: Eliminazione PL privato

- 1 Descrizione attività:
Lavori per nuovi sottopassaggi per eliminazione PL Privato ambito Fidenza linea Fidenza - Cremona
- Periodo di lavorazione:
14 novembre - 27 dicembre 2026, mesi di Gennaio 2027
- Impegno di personale:
- CMIT: 2
- CMIA: 2
- 2 Interruzioni notturne: Notturne Fidenza (a) - Fidenza (b) dal L/M al V/S dal 07 novembre 2026 al 24 novembre 2026 dalle 00:00 alle 04:00 / e dal 18 gennaio 2027 al 31 gennaio 2027 interruzione Lancia Fidenza - Sottopassaggio notti dal D/L al G/V
- 3 Interruzioni puntuali Diurne: No
- 4 Interruzioni weekend/festivi: SI W3: 14/15 novembre e W3: 19/21 dicembre
- 5 Variazioni di Orario No standard: No
- 6 Variazioni di fascia: Fumo di domenica M1 diventa per alcuni agenti P
- 7 Notte >8 h: No
- 8 Repetibilità max 10 giorni: No

8 Bologna-Piacenza: Rinnovo binari a campate/ Rinnovo TE Scalo Parma/Sottopassaggio Comune di Reggio Emilia

- 1 Descrizione attività: Rinnovo binario a campate ambito Parma/ rinnovo a campate ambito stazione di C.Guelfo/ rinnovo TE scalo merci di Parma/lavori al nuovo Sottopassaggio del Comune di Reggio Emilia (Via Roma) km 62 - 300
- Periodo di lavorazione:
W3: 20/23 e W3: 27/30 novembre 2026
- Impegno di personale:
- CMIA: 8
- CMIS: 4
- CMIE: 8
- 2 Interruzioni notturne: SI (interruzione continuativa)
- 3 Interruzioni puntuali diurne: NO (interruzione continuativa)
- 4 Interruzioni weekend/festivi: SI (interruzione continuativa) W3: 20/23 novembre e 27/30 novembre
- 5 Variazioni di Orario No standard: No
- 6 Variazioni di fascia: Fumo di domenica M1 diventa per alcuni agenti P
- 7 Notte >8 h: No
- 8 Repetibilità max 10 giorni: No



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

9	Stazione di Fidenza
1 Descrizione attività: Demolizione binari 1° e 2° Sica/ rinnovo deviatore 14A/ Rinnovo binario 1° Est Periodo di lavorazione: Gennaio 2027 (dal 11 al 31 gennaio) Impegno di personale: - CMLE: 2 - CMLE: 3 - CMSE: 2 2 Interruzioni notturne: Interruzione notturne per rinnovo deviatore 14A e binario 1° Est line 1/ Rinnovo Fidenza nott dal L/M al V/S dalle 23:30 alle 05:00 3 Interruzioni puntuali Diurne: Interruzione giornaliera linea Fidenza-Pomona 4 Interruzioni continuative: Interruzione continuativa della scala Sica della stazione di Fidenza 5 Variazioni di Orario: No standard: NO 6 Variazioni di fascia: NO 7 Notte >8 h: NO 8 Repetibilità max 10 giorni: NO	
10	Bologna-Milano AV/AG: Molatura Rotaie
1 Descrizione attività: Molatura Rotaie con treno molatore varie tratte Periodo di lavorazione: Mese di novembre 2026 periodo 05/09 novembre Impegno di personale: - CMLE: 1 - CMSE: 0 - CMLE: 0 2 Interruzioni diurne di linea: NO 3 Interruzioni notturne: SI dalla D/L al V/S dalle 00:00 alle 04:50 4 Interruzioni weekend/festivi: NO 5 Variazioni di Orario: No standard: NO 6 Variazioni di fascia: NO 7 Notte >8 h: NO 8 Repetibilità max 10 giorni: NO	

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

11	Bologna-Milano AV/AG: Scarico Pietrisco e Livellamento
1 Descrizione attività: Scarico pietrisco, livellamento binario e smantellamento varie tratte Periodo di lavorazione: Mese di Novembre e Dicembre 2026 Impegno di personale: - CMLE: 2 - CMSE: 0 - CMLE: 0 2 Interruzioni diurne di linea: NO 3 Interruzioni notturne: nott dal L/M al V/S dalle 00:00 alle 04:50 4 Interruzioni weekend/festivi: NO 5 Variazioni di Orario: No standard: NO 6 Variazioni di fascia: NO 7 Notte >8 h: NO 8 Repetibilità max 10 giorni: NO	
12	Bologna-Milano AV/AG: Sostituzione "pezzi" di Rotaie
1 Descrizione attività: Lavoro di sostituzione pezzi di rotaie e relative saldature alluminotermiche varie tratte Periodo di lavorazione: Mese di novembre 2026 Impegno di personale: - CMLE: 2 - CMSE: 2 - CMLE: 0 2 Interruzioni diurne di linea: NO 3 Interruzioni notturne: Interruzioni dalla D/L al V/S dalle 00:00 alle 04:50 4 Interruzioni weekend/festivi: NO 5 Variazioni di Orario: No standard: NO 6 Variazioni di fascia: NO 7 Notte >8 h: NO 8 Repetibilità max 10 giorni: NO	

DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

13 Bologna-Milano AV/AC: Scarico rotaie

1 Descrizione attività:
Lavoro di scarico rotaie da mt 108 per futuro cambio ferro

Periodo di lavorazione:
Dicembre 2026 - Gennaio e Febbraio 2027

Impegno di personale
- UMLA: 2
- UMS: 0
- UMTT: 2

2 Interruzioni notturne: Interruzioni dalla D/L al V/S dalle 00:00 alle 04:50

3 Interruzioni puntuali diurne: NO

4 Interruzioni weekend/festive: NO

5 Variazioni di Orario No standard: NO

6 Variazioni di fascia: NO

7 Notti >8 h: NO

8 Repetibilità max 10 giorni: NO

14 Modena-Suzzara: Rinnovo binario

1 Descrizione attività:
Rinnovo del 1° e 2° binario con metodo a campate compreso riarmamento massicciata

Periodo di lavorazione:
Gennaio 2027 (dall'11 al 31)

Impegno di personale
- UMLA: 3
- UMS: 2
- UMTT: 2

2 Interruzioni notturne: stazione di Suzzara dalle 00:30 alle 05:00 dal L/M al V/S

3 Interruzione diurne: NO

4 Interruzioni weekend/festive: NO

5 Variazioni di Orario No standard: NO

6 Variazioni di fascia: NO

7 Notti >8 h: NO

8 Repetibilità max 10 giorni: NO



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

15 Bologna-Milano AV/AC: Cambi Fila

1 Descrizione attività:
Sostituzione linea di Contatto varie trame

Periodo di lavorazione:
Novembre 2026

Impegno di personale
- UMLA: 0
- UMS: 0
- UMTT: 4

2 Interruzioni notturne: interruzioni dalla D/L al V/S dalle 00:00 alle 04:50

3 Interruzione diurne: NO

4 Interruzioni weekend/festive: NO

5 Variazioni di Orario No standard: NO

6 Variazioni di fascia: NO

7 Notti >8 h: NO

8 Repetibilità max 10 giorni: NO

16 Bologna-Milano AV/AC: Revisione TE

1 Descrizione attività:
Revisione alla linea di Contatto

Periodo di lavorazione:
Dicembre 2026 - Gennaio e Febbraio 2027

Impegno di personale
- UMLA: 0
- UMS: 0
- UMTT: 4

2 Interruzioni notturne: interruzioni dalla D/L al V/S dalle 00:00 alle 04:50

3 Interruzione diurne: NO

4 Interruzioni weekend/festive: NO

5 Variazioni di Orario No standard: NO

6 Variazioni di fascia: NO

7 Notti >8 h: NO

8 Repetibilità max 10 giorni: NO



DOIT Bologna – UT Emilia

Piano di Attività Novembre 2026- Febbraio 2027

17 Bologna-Piacenza: Robiera Innalzamento h55 e lavori pensilina
1 Descrizione attività: Innalzamento h55 marciapiede 1 e manutenzione Pensilina
Periodo di lavorazione: Febbraio 2027
Impegno di personale - UMLA: 1 - UMS: 0 - UMT: 1/2
2 Interruzioni notturne: interruzioni dalla D/L al V/S dalle 00:00 alle 04:30 (Pan + Promiscuo)
3 Interruzione diurne: NO
4 Interruzioni weekend/festive: NO
5 Variazioni di Orario No standard: NO
6 Variazioni di fascia: NO
7 Notte >8 h: NO
8 Reperibilità max 10 giorni: NO

18 Bologna-Piacenza parte bassa: MSA
1 Descrizione attività: Lavori di sostituzione componenti, GII e livellamento
Periodo di lavorazione: Gennaio, Febbraio 2027
Impegno di personale - UMLA: 3/4 - UMS: 3 - UMT: 2/3
2 Interruzioni notturne: interruzioni dalla D/L al V/S dalle 00:30 alle 04:30
3 Interruzione diurne: NO
4 Interruzioni weekend/festive: NO
5 Variazioni di Orario No standard: NO
6 Variazioni di fascia: NO
7 Notte >8 h: NO
8 Reperibilità max 10 giorni: NO



DOIT Bologna

PdA UT ROMAGNA

Da Novembre 2026 a Febbraio 2027

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' followed by a horizontal line and a small loop.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

n°	Località / tratta	Linea	Descrizione attività	Ditta
1	Occhiobello - S. Pietro in Casale	BO-PD	Attività progettistiche alla realizzazione dell'ACCM da Occhiobello (0) a San Pietro in Casale (c)	FS Engineering
2	Castel Maggiore - S. Pietro in Casale	BO-PD	Attivazione allaccio della nuova linea FER	CLJF + GCF
3	Ferrara	BO-PD	Completamento attività ARMAMEN/TO a seguito allaccio della linea FER	CLJF + GCF
4	Ferrara	BO-PD	Realizzazione l'arco di Sezionamento in stazione di Poggio Renatico (Appalto 1A ACCM BO-PD)	ALSTOM
5	Poggio Rusco	BO-VR	Rinnovamento con risanamento della massicciata del binario Pari e dispari della stazione di Poggio Rusco	CLJF
6	Varignara - Castel San Pietro	BO-RN	Completamento rinnovo TI Varignara - Castel San Pietro	GCF
7	PM Mirandola - Castel San Pietro	BO-RN	Realizzazione Impianto RTB km 18+550	Alstom
8	Lido di Classe / Savio	FE-RN	Rinnovo deviatoio in stazione di Lido di Classe / Savio	CLJF
9	Portomaggiore	FE-RN	Rinnovo deviatoio in stazione di Portomaggiore	CLJF
10	Russi - Ravenna	CBOL-RA	Scarico rotaie propedeutico al rinnovamento del binario con risanamento della massicciata delle linee CBOL-RA e FE	CLJF
11	Russi - Ravenna	FE-RA	Scarico rotaie propedeutico al rinnovamento del binario con risanamento della massicciata delle linee CBOL-RA e FE	CLJF
12	Ferrara	BO-PD	Completamento attività ARMAMEN/TO a seguito allaccio della linea FER	CLJF + GCF
13	Ferrara	BO-PD	Completamento del rinnovo del binario con risanamento della massicciata del binario 1 di Ferrara	CLJF
14	Ferrara	BO-PD	Rinnovamento con risanamento della massicciata del binario 7 di Ferrara	CLJF
15	Tratte varie	BO-PD	Manutenzione Straordinaria TI - Cambio Fila 2027 linea BO-PD	GCF
16	Bologna Interporto	BO-PD	Rinnovo deviatoio in stazione di Bologna Interporto	CLJF
17	Occhiobello - S. Pietro in Casale	BO-PD	Attività progettistiche alla realizzazione dell'ACCM da Occhiobello (0) a San Pietro in Casale (c)	FS Engineering
18	Santarcangelo - Rimini	BO-RN	Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (1^ Fase)	Railway Ent.
19	Santarcangelo - Rimini	BO-RN	Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (2^ Fase)	Railway Ent.
20	Imola - Castel Bolognese	BO-RN	Impermeabilizzazione ponte al km 39+206	Railway Ent.
21	Santarcangelo - Rimini	FE-RN	Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (3^ Fase)	Railway Ent.
22	Tratte varie	BO-RN	Manutenzione Straordinaria TI - Cambio Fila 2027 linea BO-RN	GCF
23	Imola	BO-RN	Realizzazione barriere antirumore ambito stazione di Imola	DINV
24	Castel Bolognese - Solarolo	CBOL-RA	Nuovo cavalcavia variante S.S. 9 Via Emilia km 0+763	ANAS
25	Castel Bolognese - Russi	CBOL-RA	Rinnovamento con risanamento della massicciata	CLJF
26	Bagnacavallo - Russi	CBOL-RA	Demolizione e ricostruzione cavalcavia km 20+169 linea Castel Bolognese - Ravenna	ASPI
27	Bacino della Romagna	FE-RN	Manutenzione Straordinaria TI - Cambio Fila 2027 Bacino della Romagna	GCF

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

1	BO_PD: ACCM Occhiobello - S. Pietro in Casale
1	Descrizione Attività: Attività predefinite alla realizzazione dell'ACCM da Occhiobello (i) a San Pietro in Casale (e) Periodo di lavorazione: 05 ottobre - 18 dicembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 00:00 alla 04:30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

2	BO_PD: Attivazione allaccio della nuova linea FER
1	Descrizione Attività: Attivazione allaccio nuovo tracciato Ferrara-Gaibandella con contestuale dismissione tracciato FI:-B° Rivana-Gaibandella compresa la riconfigurazione del CTC del bacino della Romagna Periodo di lavorazione: Dal 06 al 10 novembre 2026
2	Interruzioni Notturne: SI
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: Interruzione continuativa dalle ore 22.00 del 06/11 alle ore 07.00 del 10/11/2026
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: SI. Per la gestione di concomitanti lavorazioni il turno potrà cambiare da M1 in M o P
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

3	BO_PD: Completamento attività ARMAMENTO a seguito allaccio della linea FER
1	Descrizione Attività: Attività ARM relative a binari e deviatori di accesso alla bretella FJR di nuova realizzazione
	Periodo di lavorazione: 10 novembre - 18 dicembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne da domenica a venerdì con durata variabile da 4,5 a 5 ore (ininteressa BO-PD e FJR-RN)
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

4	BO_PD: Realizzazione Tronco di Sezionamento in stazione di Poggio Renatico (ACCM)
1	Descrizione Attività: Realizzazione Tronco di Sezionamento TE propedeutico alla futura attivazione dell'ACCM BO-PD
	Periodo di lavorazione: Notti 14/15 e 15/16 novembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Notti 14/15 e 15/16 novembre 2026 della durata di circa 7 ore ciascuna
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

5	BO VR: Rinnovamento binari di corsa della stazione di Poggio Rusco con risanamento della massicciata
1	Descrizione Attività: Rinnovamento a campate ambito stazionamento dei binari di corsa della stazione di Poggio Rusco con risanamento della massicciata
	Periodo di lavorazione: 21 settembre - 12 novembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 270 minuti dal lunedì al venerdì
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

6	BO RN: Completamento rinnovo TE Varignana - Castel San Pietro
1	Descrizione Attività: Completamento attrezzaggio sostegni TI1 con adeguamento allo standard 440 mmq della LDC fra le stazioni di Varignana e Castel San Pietro
	Periodo di lavorazione: 30 agosto - 18 dicembre 2026
2	Interruzioni Notturne: interruzioni notturne di binario con contemporanea del binario attiguo da domenica a giovedì della durata di 300 minuti
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

7	BO_RN: Realizzazione Impianto RTB
1	Descrizione Attività: Realizzazione impianto RTB al km 18+550 della tratta PM Mirandola - Castel San Pietro della linea BO-RN
	Periodo di lavorazione: dal 9 al 13 novembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne di binario con contemporanea del binario attiguo da domenica a giovedì della durata di 5 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti>8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

8	FE_RN: Rinnovo deviatoi Stazione Lido di Classe / Savio
1	Descrizione Attività: Rinnovo di n°4 deviatoi nella stazione di Lido di Classe / Savio (1A, 1B, 2A e 2B)
	Periodo di lavorazione: 12 novembre - 11 dicembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 5 ore dalla notte L/M alla notte V/S
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: dal 14 al 15 Novembre
5	Variazioni di Orario No standard: NO
6	Variazioni fascia: SI (per il weekend M1 diventa M o P)
7	Notti>8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

9	FE RN: Rinnovo deviatioio stazione di Portomaggiore
1	Descrizione Attività: Rinnovo deviatioio 101B della stazione di Portomaggiore Periodo di lavorazione: 14 dicembre - 18 dicembre 2026
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 6 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti>8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

10	CBOL-RA: Scarico rotaie propedeutico al rinnovamento con risanamento della massicciata della tratta Russi-Ravenna
1	Descrizione Attività: Scarico rotaie propedeutico al rinnovamento con risanamento della massicciata della tratta Russi-Ravenna la cui data di inizio è prevista la notte 11/12 gennaio 2027 Periodo di lavorazione: Dal 09 al 18 dicembre 2026 con nastro lavorativo da L/M a V/S
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 4 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti>8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

11 FAE-RA: Scarico rotaie propedeutico al rinnovamento con risanamento della massiciata della tratta Russi-Ravenna

1	Descrizione Attività: Scarico rotaie propedeutico al rinnovamento con risanamento della massiciata della tratta Russi-Ravenna la cui data di inizio è prevista a seguito del completamento del rinnovo della CBOJ-RA
	Periodo di lavorazione: Dal 09 al 18 dicembre 2026 con nastro lavorativo da L/M a V/S
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 4 ore
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

12 BO_PD: Completamento attività ARMAMENTO a seguito allaccio della linea FER

1	Descrizione Attività: Attività ARM relative a binari e deviatori di accesso alla brecella FER di nuova realizzazione
	Periodo di lavorazione: Dal 10 al 21 gennaio 2027
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne da domenica a venerdì con durata variabile da 4,5 a 5 ore (interessa BO-PD e FIJ-RN)
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

13	BO PD: Rinnovo con risanamento del binario 1 della stazione di Ferrara
1	Descrizione Attività: Completamento del rinnovo a campate con risanamento della massicciata del 1° binario di l'errara
	Periodo di lavorazione: Dal 11 al 25 gennaio 2027 dalla notte L./M alla notte V/S
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 5 ore ambito stazione di l'errara
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

14	BO PD: Rinnovo con risanamento del binario 7 della stazione di Ferrara
1	Descrizione Attività: Rinnovo a campate con risanamento della massicciata del 7° binario di l'errara (estesa 820 metri)
	Periodo di lavorazione: Dal 26 gennaio al 19 febbraio 2027 dalla notte L./M alla notte V/S
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne della durata di 5 ore ambito stazione di l'errara
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.


DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

15	BO	PD: Manutenzione Straordinaria TE - Cambio Filo 2027
1	Descrizione Attività:	Sostituzione del filo sagomato in 12 tratte della linea BO-PD
	Periodo di lavorazione:	Dal 16 febbraio al 04 marzo 2027
2	Interruzioni Notturne:	Interruzioni notturne di linea della durata di 4,5 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne:	p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi:	p.m.
5	Variazioni di Orario No standard:	p.m.
6	Variazioni fascia:	p.m.
7	Notti > 8h:	p.m.
8	Reperibilità max 10 g:	p.m.

16	BO	PD: Rinnovo deviatoio in stazione di Bologna Interporto
1	Descrizione Attività:	Rinnovo del deviatoio 105 di Bologna Interporto
	Periodo di lavorazione:	Dal 22 al 26 febbraio 2027
2	Interruzioni Notturne:	p.m.
3	Interruzioni puntuali Diurne:	interruzioni diurne di 5 ore generalmente a partire dalle ore 09:00
4	Interruzioni weekend/festivi:	p.m.
5	Variazioni di Orario No standard:	p.m.
6	Variazioni fascia:	Si necessita di incrementare il turno del mattino M 07:00-14:56 di 1h rinunciando a prestazioni P o N
7	Notti > 8h:	p.m.
8	Reperibilità max 10 g:	p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

17	BO PD: ACCM Occhiobello – S. Pietro in Casale
1	Descrizione Attività: Attività propedeutiche alla realizzazione dell'ACCM da Occhiobello (i) a San Pietro in Casale (e)
	Periodo di lavorazione: 01 gennaio - 28 maggio 2027
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni notturne dal lunedì al venerdì dalle 00:00 alla 04:30
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti>8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

18	BO RN: Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (1^ fase)
1	Descrizione Attività: Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (3 car-pate del binario pari) con contemporanea attività propedeutiche alla TM del binario dispari Periodo di lavorazione: Periodo 1: Attività propedeutiche binario pari dal 03 al 07 gennaio 2027 Periodo 2: Interruzione continuativa dal 08 al 11 gennaio 2027 Periodo 3: Finiture e completamenti binario pari e attività propedeutiche alla sostituzione TM dispari dal 11 al 14 gennaio 2027
2	Interruzioni Notturne: Periodo 1: Interruzioni notturne della durata di 4 ore Periodo 3: Interruzioni notturne della durata di 4 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: Periodo 2 Interruzione continuativa dal 08 al 11 gennaio 2027 (durata 55 ore)
5	Variazioni di Orario No standard: SI, per il Periodo 2
6	Variazioni fascia: SI (per il periodo 2) M1 potrebbe diventare M o P
7	Notti>8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

19	BO RN: Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (2ª fase)
1	Descrizione Attività: Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (3 campate del binario dispari) Periodo di lavorazione: Periodo 1: Attività propedeutiche binario pari dal 11 al 14 gennaio 2027 Periodo 2: Interruzione continuativa dal 15 al 18 gennaio 2027 Periodo 3: Finiture e completamenti binario dispari dal 18 al 22 gennaio 2027
2	Interruzioni Notturne: Periodo 1: Interruzioni notturne della durata di 4 ore Periodo 3: Interruzioni notturne della durata di 4 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: Periodo 2 Interruzione continuativa dal 15 al 18 gennaio 2027 (durata 55 ore)
5	Variazioni di Orario No standard: SI, per il Periodo 2
6	Variazioni fascia: SI (per il periodo 2) MI potrebbe diventare M o P
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

20	BO RN: Impermeabilizzazione del ponte al km 39+206 (Rio Sanguinario)
1	Descrizione Attività: Impermeabilizzazione del ponte al km. 39+206 (Rio Sanguinario) della tratta Imola - Castel Bolognese Periodo di lavorazione: Periodo 1: Interruzione continuativa dal 15 al 18 gennaio 2027 Periodo 2: Finiture e completamenti dal 18 al 22 gennaio 2027
2	Interruzioni Notturne: Periodo 2: Interruzioni notturne della durata di 5 ore con contemporanea di 4 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: Periodo 1 Interruzione continuativa dal 15 al 18 gennaio 2027 (durata 55 ore)
5	Variazioni di Orario No standard: SI, per il Periodo 2
6	Variazioni fascia: SI (per il periodo 2) MI potrebbe diventare M o P
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

21	FE	RN: Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (3^ fase)
1	Descrizione Attività:	
	Sostituzione della TM 110+585 - 110+524 (3 compate del binario unico)	
	Periodo di lavorazione:	
	Periodo 1: Attività propedeutiche binario pari dal 07 al 11 febbraio 2027	
	Periodo 2: Interruzione continuativa dal 12 al 15 febbraio 2027	
	Periodo 3: finiture e completamenti binario dispari dal 15 al 18 febbraio 2027	
2	Interruzioni Notturne:	
	Periodo 1: Interruzioni notturne della durata di 4 ore	
	Periodo 3: Interruzioni notturne della durata di 4 ore	
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.	
4	Interruzioni weekend/festivi:	
	Periodo 2 Interruzione continuativa dal 12 al 15 febbraio 2027 (durata 55 ore)	
5	Variazioni di Orario No standard: SI, per il Periodo 2	
6	Variazioni fascia: SI (per il periodo 2) M1 potrebbe diventare M o P	
8	Reperibilità max 10 g: p.m.	

22	BO	RN: Manutenzione Straordinaria TE - Cambio Filo 2027
1	Descrizione Attività:	
	Sostituzione del filo sagomato in 12 tratte della linea BO-RN	
	Periodo di lavorazione:	
	Dal 11 al 27 gennaio 2027	
2	Interruzioni Notturne:	
	Interruzioni di binario della durata di 4,5 ore con interruzione contemporanea del binario attiguo della durata di 3,30 ore	
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.	
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.	
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.	
6	Variazioni fascia: p.m.	
7	Notti>8h: p.m.	
8	Reperibilità max 10 g: p.m.	

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

23	BO-RN: Realizzazione Barriere Antirumore
1	Descrizione Attività: Realizzazione barriere antirumore ambito stazione di Imola (dal km 32+000 al km 33+660), conto DINV
	Periodo di lavorazione: Dal 22 febbraio al 11 aprile 2027
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni di binario della durata di 4,5 ore con interruzione contemporanea del binario attiguo della durata di 3,00 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

24	CBOL-RA: Nuovo cavalciferrovia variante S.S. 9 Via Emilia km 0+763
1	Descrizione Attività: Nuovo cavalciferrovia variante S.S. 9 Via Emilia km 0+763 (attività conto ANAS)
	Periodo di lavorazione: Dal 01 gennaio al 15 aprile 2027
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni del binario unico della durata di 4 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

25	CBOL RA: Rinnovamento con risanamento della massicciata della tratta Russi - Ravenna	
1	Descrizione Attività: Rinnovamento con risanamento della massicciata della tratta Russi - Ravenna dal km 25+434 al km 38+714 (metri 13,280)	
	Periodo di lavorazione: Dal 11 gennaio al 26 febbraio 2027	
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni linea CBOL-RA della durata di 6 ore con interruzione contemporanea linea FAL-RA della durata di 6 ore	
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.	
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.	
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.	
6	Variazioni fascia: p.m.	
7	Notti>8h: p.m.	
8	Reperibilità max 10 g: p.m.	

26	CBOL RA: Demolizione e ricostruzione cavalcavia km 20+169	
1	Descrizione Attività: Demolizione e ricostruzione cavalcavia km 20+169, demolizione viadotto esistente carreggiata ovest	
	Periodo di lavorazione: Dal 11 al 17 gennaio 2027	
2	Interruzioni Notturne: N°7 interruzioni linea CBOL-RA della durata di 4,5 ore	
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.	
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.	
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.	
6	Variazioni fascia: p.m.	
7	Notti>8h: p.m.	
8	Reperibilità max 10 g: p.m.	

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

[Handwritten signature in black ink]



DOIT Bologna – UT Romagna

Piano di Attività da Novembre 2026 a Febbraio 2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27	FE RN: Manutenzione Straordinaria TE - Cambio Filo 2027
1	Descrizione Attività: Sostituzione del filo sagomato in 13 tratte del giurisdizione del Badno della Romagna Periodo di lavorazione: Dal 28 gennaio al 15 febbraio 2027
2	Interruzioni Notturne: Interruzioni di binario della durata di 5 ore
3	Interruzioni puntuali Diurne: p.m.
4	Interruzioni weekend/festivi: p.m.
5	Variazioni di Orario No standard: p.m.
6	Variazioni fascia: p.m.
7	Notti > 8h: p.m.
8	Reperibilità max 10 g: p.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

